
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Se encuentra ubicado en la ciudadela Universitario, sector noreste, lado edificio Vicerrectorado. El edificio contará con 6 niveles destinados a auditorios, sector educativo, sector administratiw y servicios. EI edificio está destinado al desarrollo de actividades educativas y administrativas el área de Posgrado dentro de la Ciudadela Universitaria de la u.A. T.F. Cuenta con dos auditorios con capacidad de 180 personas cada uno, aulas de clases y defensa de tesis, laboratorios, servicios como baños Con cantidad de acuerdo a norma, tendrá dos ascensores, una grada COrñõ conectores verticales ubicados en el hall de distribución de cada nivel. Los pisos y Son plantas y el último nivel responde a 10 necesidad de crear espcios de descanso y alojamiento a docentes foráneos que lleguen a dar clases o seminarios, cuenta también el último piso con una cafeterio, aulas y laboratorios. La planta baja se caracteriza contar con 2 Ingresos, un hall de distribución y un auditorio con capacidad de 180 usuarios, área administmtiw, biblioteca y sala de exposiciones. Sector de servicios y áreas de circulación con conectores verticales. Presenta desniveles en tres sectores dado el desnivel del terreno. En esta Fase de ejecución del proyecto se tienen 3 Módulos: Módulo I- Se ejecutaran de obra gruesa en Obras civiles simultáneamente en trabajos ya existentes y trabajos nuevos; en IOS siguientes 'temes, Instalación de Faenas, Limpieza de escombros en pozos existentes en las excavaciones que tienen ya zapatas vaciadas, excavación en terreno semiduro para ampliar área de vaciado de zapatas- refuerzo de enferradura (kg) en zapatas a incrementar área, vaciado de HoSo H25 incremento área de — refuerzo de armaduras de columnas amadas en enferradura (kg)existentes, HOSO H25 para columnas, relleno y compactado — Se continuara con trabajos paralelamente con IOS itemes nuevos de Obra gruesa desde nivel fundación hasta primera losa, se ejecutaran los siguientes itemes: excavación de terreno semiduro, de HOPO zapatas, Zapatas — vigas de Arriostre columnas — Vigas — losas prefabricadas — escalera todas estas de Hormigón armado, se ejecutaran también el relleno y retiro de escombros, todo 10 mencionado llega hasta Ia primera losa; posterior a esto se continuará con trabajos de Obra gruesa desde lera Losa — 2da Losa, se ejecutaran IOS siguientes itemes: columnas — Vigas — losas prefabricadas — escalera todas estas de Hormigón armado. rodo 10 mencionado líneas arriba se ejecutará en esta haciendo conocer de un proyecto de 6 plantas solo Se ejecutarán el arranque del suelo y tres losas. Módulo 2.- Esta relacionado a la parte Eléctrica del proyecto es cuando se debe dejar ductos y cajas tanto en losas Como en Vigas y columnas. Módulo 3. • Esta relacionado a Ia %nitaria del proyecto es cuando se debe dejar ductos y cajas tanto en losas como en vigas y columnas. AV. LAS BANDERAS FRENTE A LA TERMINAL NUEVA (CIUDAD DE POTOSÍ) ZONA LAS LECHERÍAS DEPARTAMENTO porosf. ZONA LONGITUD ALT. EUP. 6. CUMA : 190 33' 21.84"S : 650 45'47.73"0 : 3650.00 m. Bueno: Durante el de ejecución de obras se presentó clima adecuado a la época del año con temperaturas caracterlsticas de la estacidm 7. RELACIÓN DE DIFICULTADES paso a detallar IOS impnderables más importantes con IOS cuales ha tropezado el proyecto y los cambios efectuados para subsanar los mismos: 8. 9. Se realizó un Contrato Modificatorio con Ampliación de Plazo debido a la creación de actividades nuevas debido 01 tipo de suelo, perforación de las zapatas para los anclajes, el recalculo de Ia estructura debido a la existencia de dos niveles (dos alturas) dentro de Ia estructura del edificio y Ia optimización del proyecto. Igualmente, se modificaron los volúmenes de las diferentes actividades acorde a las mediciones y dimensiones que se tomaron en obra. Se realizó una paralización de obras en fecha 05 de enero, debido a la solicitud de Ia empresa resolución de contrato concertada; justificada por la empresa debido al alza de los precios de los materiales, transporte y mano de obra, misma que fue respondida positivamente a la empresa en fecha 10 de febrero.

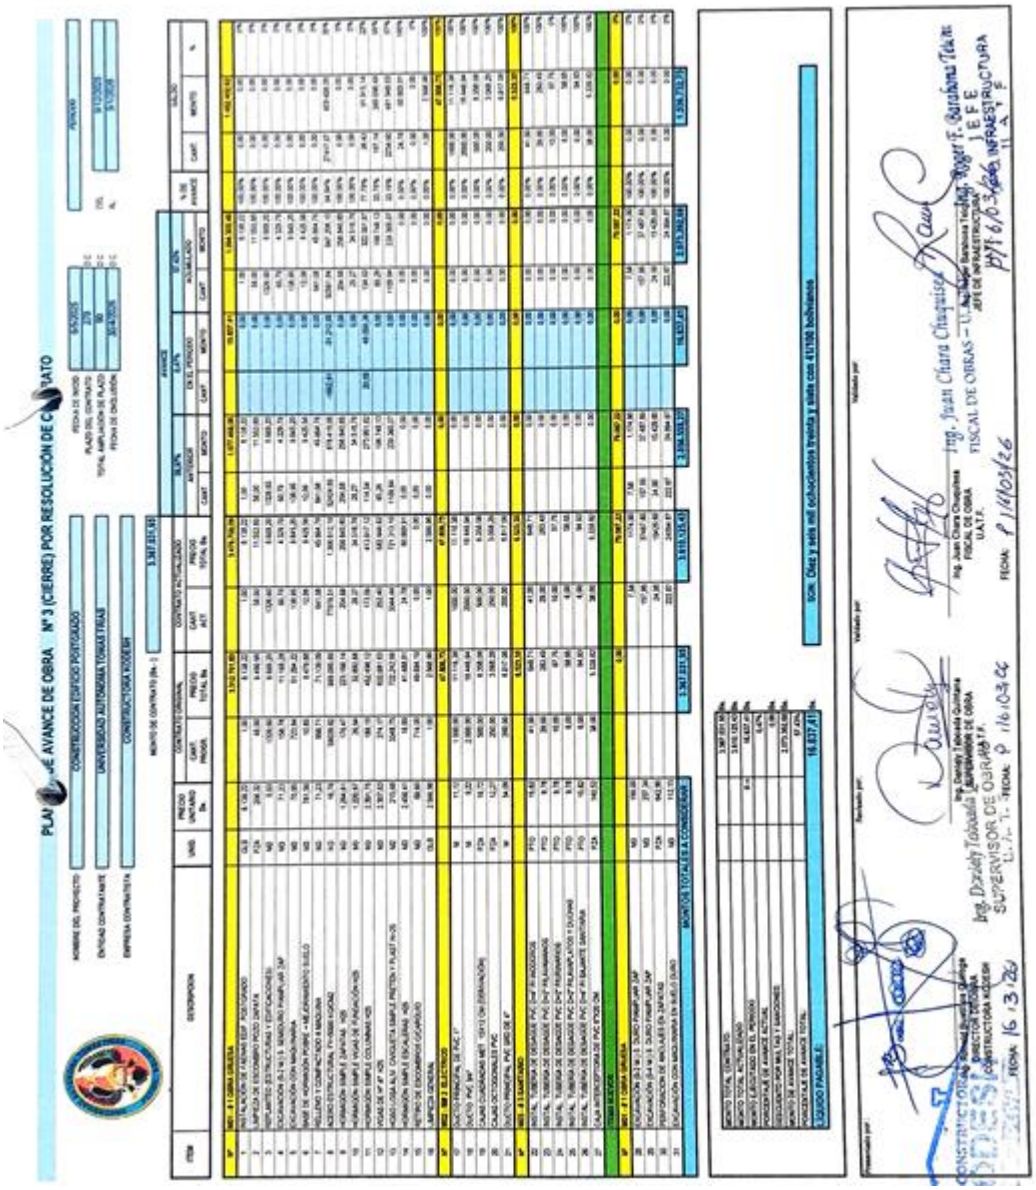


HOSO LOSA ALIV. C/VIGUETA SIMPLE PRETEN Y PLASTH=25.

N° de ITEMS	ACTIVIDAD	UNID.	Nro. De veces	DIMENSIONES			CANTIDADES PARCIALES			TOTAL
				LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	VOLUMEN (m3)	AREA (m2)	LINEAL (m)	
13	HOSO LOSA ALIV. C/VIGUETA SIMPLE PRETEN Y PLAST H=25.	M2								1109,84
	PRIMERA LOSA									
	AREA 1		1,00	AREA =	35,86			35,86		
	AREA 2		1,00	AREA =	34,67			34,67		
	AREA 3		1,00	AREA =	39,71			39,71		
	AREA 4		1,00	AREA =	45,97			45,97		
	AREA 5		1,00	AREA =	45,86			45,86		

13	HOSO LOSA ALIV. C/VIGUETA SIMPLE PRETEN Y PLAST H=25.	M2								
	AREA 6		1,00	AREA =	45,86			45,86		
	AREA 7		1,00	AREA =	27,68			27,68		
	AREA 8		1,00	AREA =	52,34			52,34		
	AREA 9		1,00	AREA =	4,75			4,75		
	AREA 10		1,00	AREA =	4,78			4,78		
	AREA 11		1,00	AREA =	5,15			5,15		
	AREA 12		1,00	AREA =	34,13			34,13		
	AREA 13		1,00	AREA =	13,27			13,27		
	AREA 14		1,00	AREA =	34,46			34,46		
	AREA 15		1,00	AREA =	27,48			27,48		
	AREA 16		1,00	AREA =	1,40			1,40		
	AREA 17		1,00	AREA =	34,04			34,04		
	AREA 18		1,00	AREA =	18,07			18,07		
	AREA 19		1,00	AREA =	22,48			22,48		
	AREA 20		1,00	AREA =	34,04			34,04		
	AREA 21		1,00	AREA =	33,87			33,87		
	AREA 22		1,00	AREA =	35,41			35,41		
	AREA 23		1,00	AREA =	11,98			11,98		
	AREA 24		1,00	AREA =	34,40			34,40		
	AREA 25		1,00	AREA =	33,87			33,87		
	AREA 26		1,00	AREA =	34,04			34,04		
	AREA 27		1,00	AREA =	18,05			18,05		
	AREA 28		1,00	AREA =	52,38			52,38		
	AREA 29		1,00	AREA =	4,78			4,78		
	AREA 30		1,00	AREA =	4,86			4,86		
	AREA 31		1,00	AREA =	5,17			5,17		
	AREA 32		1,00	AREA =	34,16			34,16		
	AREA 33		1,00	AREA =	13,33			13,33		
	AREA 34		1,00	AREA =	35,86			35,86		
	AREA 35		1,00	AREA =	34,67			34,67		
	AREA 36		1,00	AREA =	39,80			39,80		
	AREA 37		1,00	AREA =	10,66			10,66		
	AREA 38		1,00	AREA =	46,20			46,20		
	AREA 39		1,00	AREA =	10,65			10,65		
	AREA 40		1,00	AREA =	28,46			28,46		
	AREA 41		1,00	AREA =	25,24			25,24		

de

GEOMETRIA SISTEMA DE EJES PRIMERA LOSA
ESC. 1a100

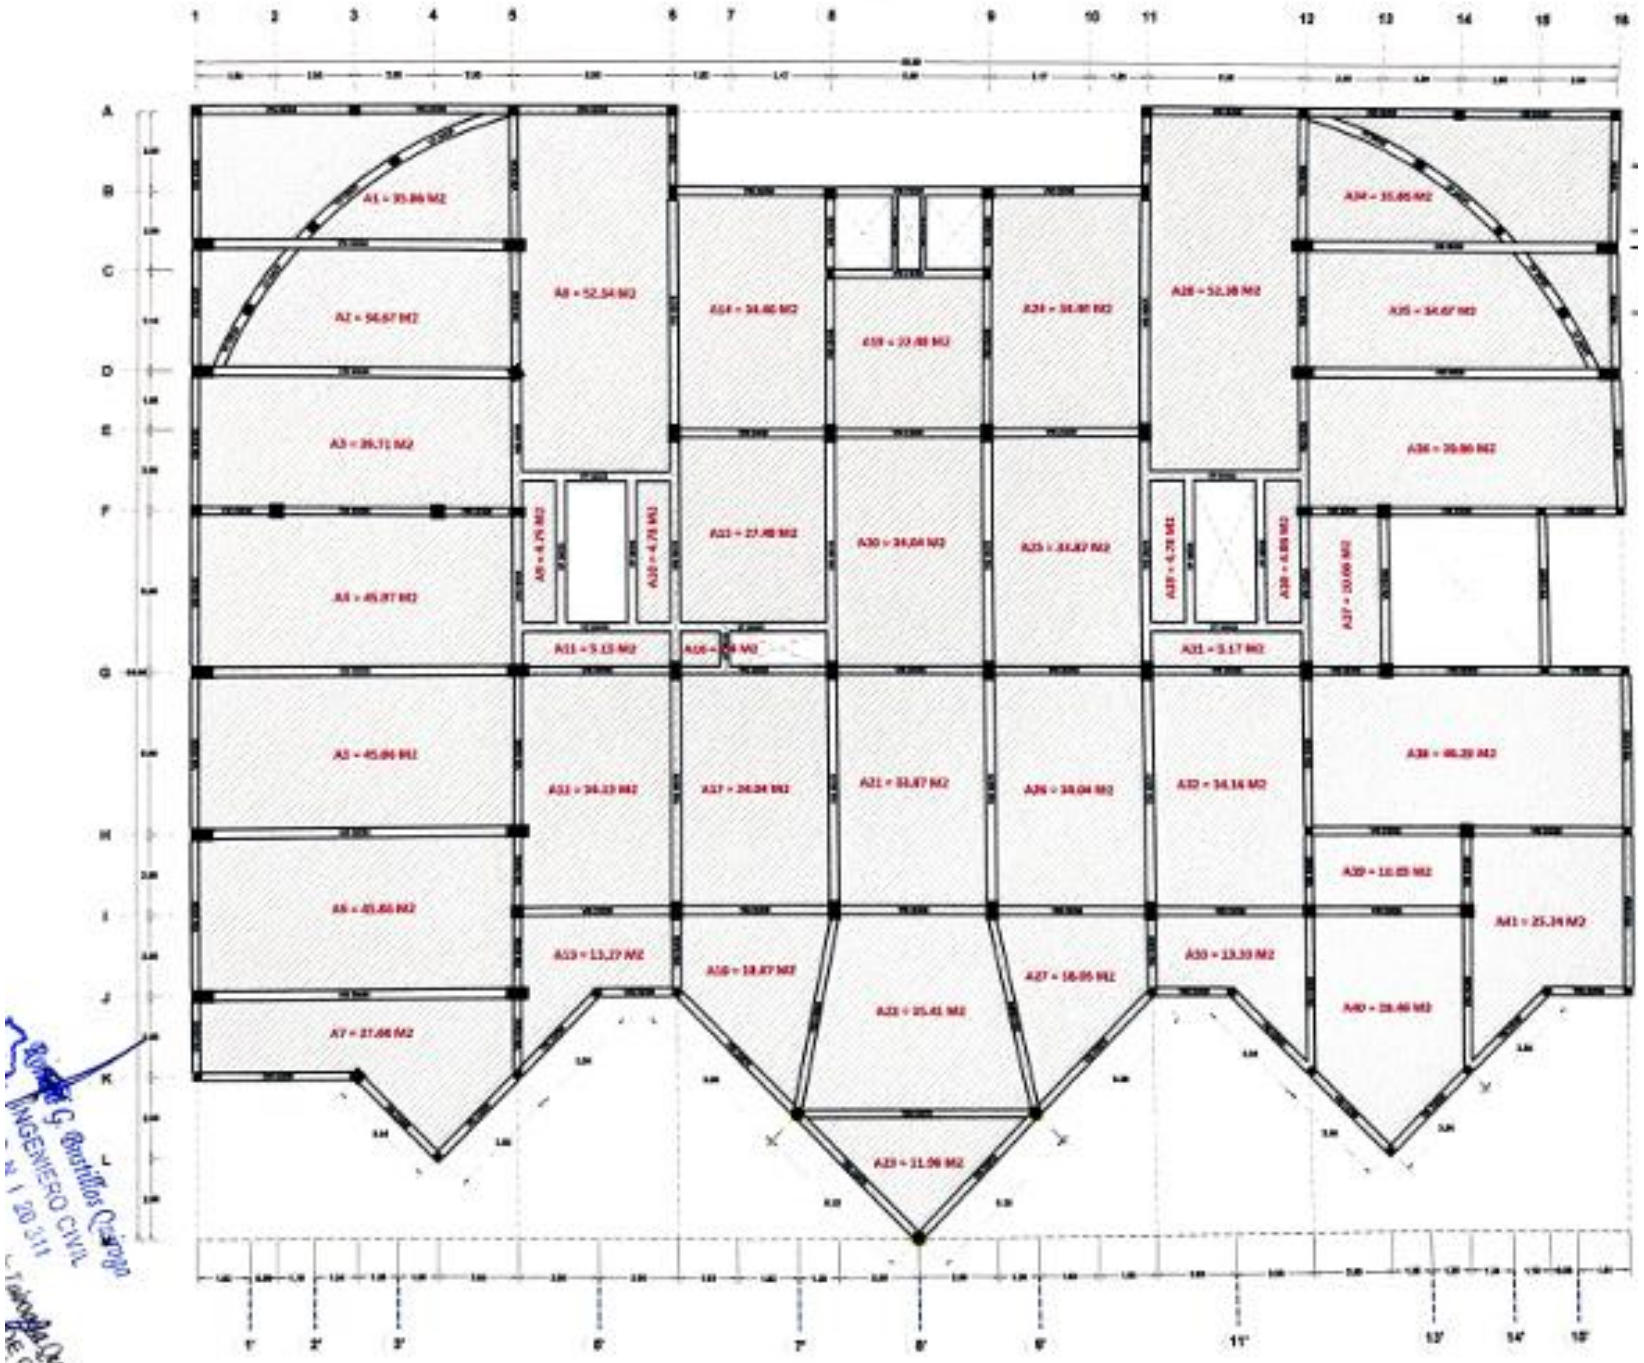










Ing. Daniel Taborda Quintana


Ronald G... INGENIERO CIVIL M.N. 120.311

VIGAS Y LOSA



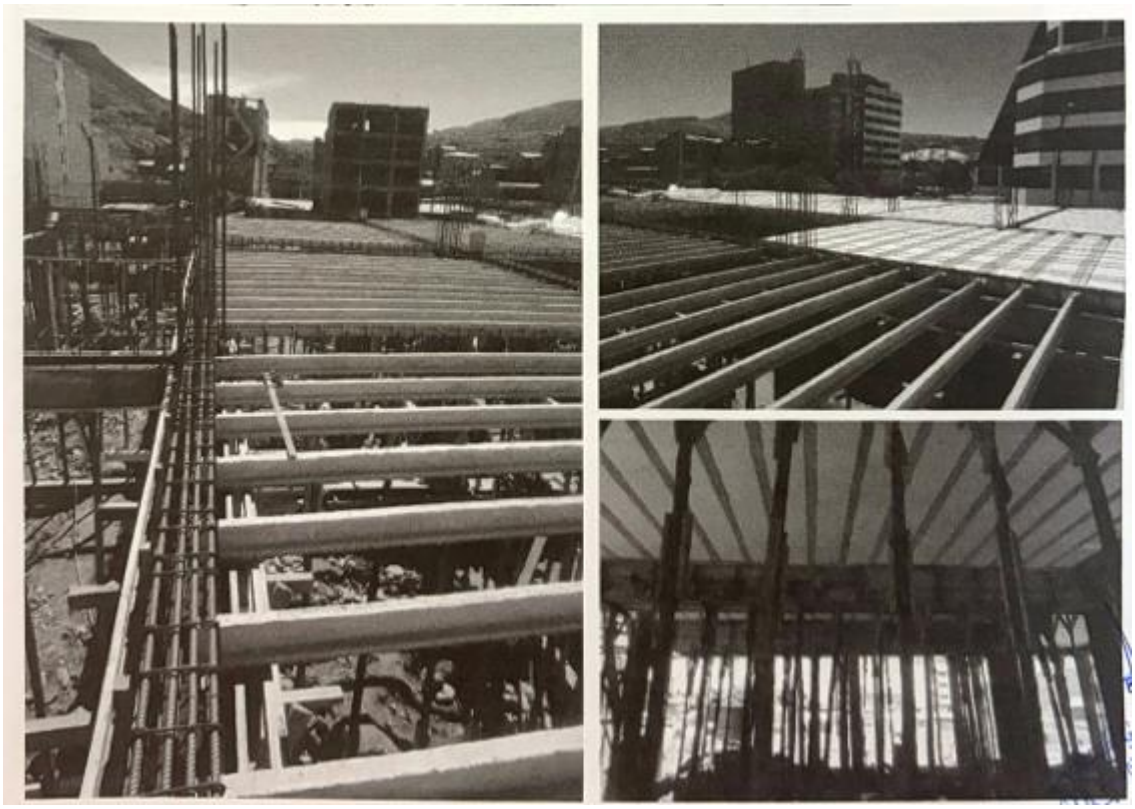



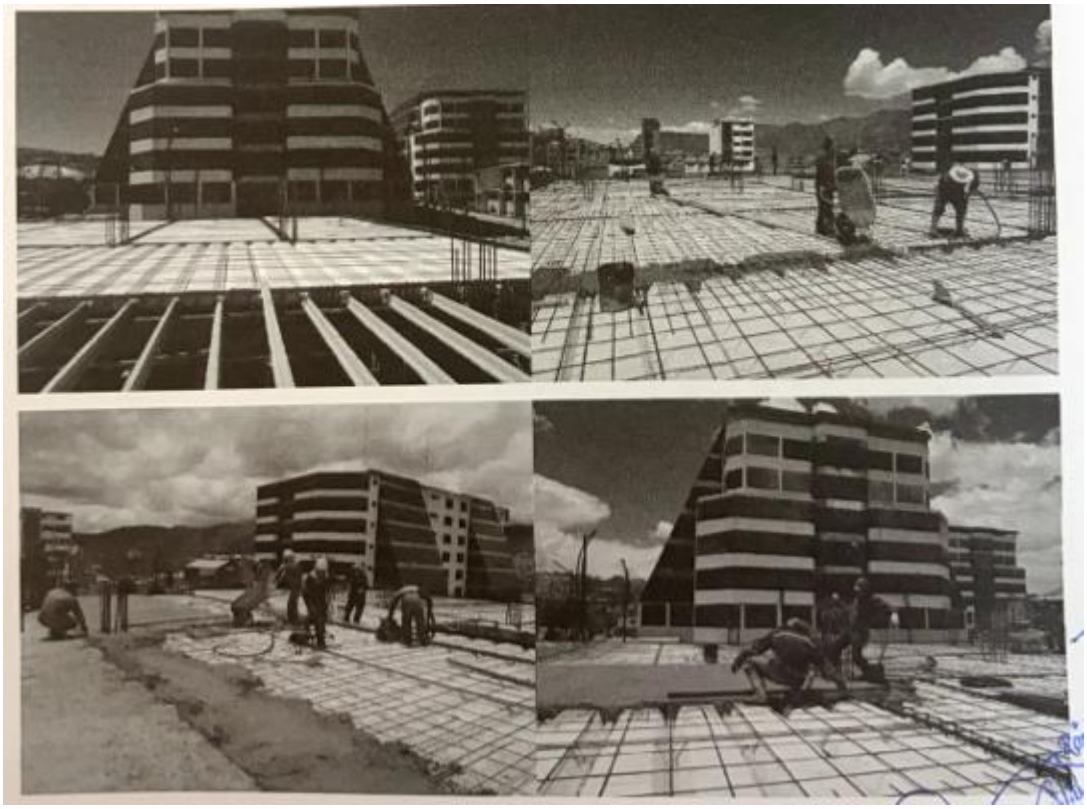

CERTIFICADO DE CALIDAD

VIGUETAS PRETENSADAS VP

FECHA: 27 de noviembre de 2025
CLIENTE / SOLICITANTE: EMPRESA CONSTRUCTORA KODESH
PROYECTO: CONSTRUCCION EDIFICIO DE POSTGRADO
SOBRECARGA ADMISIBLE: 400 Kg/m2
ESPESOR DE LOSA: 20 cm + 5 cm= 25 cm
SEPARACIÓN ENTRE EJES: 50 cm
LUZ MÁXIMA DE VIGUETAS: 7.50 m
CONSIDERACIONES: Simplemente Apoyado

Las Viguetas Pretensadas y los Complementos de Poliestireno Expandido utilizados en la presente obra fueron diseñados para la carga total indicada, siempre y cuando la carpeta de compresión sea ejecutada de acuerdo a las Normas Nacionales vigentes para el Proyecto, cumpliendo con una resistencia mínima característica del Hormigón de 21 Mpa.

La continuidad de las losas se debe materializar con aceros de continuidad y todos los pasos de montaje establecidos por PRETENSA deben ser cumplidos adecuadamente. Hacemos conocer que nuestros productos tienen las propiedades indicadas en las hojas técnicas que están a disposición del cliente en nuestra página web (www.pretensa.com).

PRETENSA cuenta con un laboratorio avanzado que trabaja bajo un sistema de gestión de calidad. En nuestra producción utilizamos componentes seleccionados, incorporando agregados de la mejor calidad, además del uso de aceros especiales de alta resistencia.

PRETENSA es la primera empresa en el rubro de la construcción que obtuvo certificación de calidad (1997): NB-997, ISO 9001, para las Viguetas Pretensadas, sus productos y sistema de calidad, cumpliendo la Norma Boliviana de viguetas y/o elementos prefabricados de Hormigón Pretensado.



PRETENSA
ingeniería & construcción

Zona Mallasilla, frente al Club de Golf. La Paz, Bolivia.
Casilla: 5965
Tel.: +591(2) 274 54 54 / Fax: +591(2) 274 54 74
Email: info@pretensa.com

up

Certificado de Calidad

POLIESTIRENO EXPANDIDO EPS

UNICON
Pretensados & EPS

FECHA: 27 de noviembre de 2025

CLIENTE SOLICITANTE: EMPRESA CONSTRUCTORA KODESH

PROYECTO: CONSTRUCCION EDIFICIO DE POSTGRADO

PRODUCTO: PLASTOBLOQ DE 20 x 100 x 44cm.

DENSIDAD: 10 Kg/m3

CONSIDERACIONES: 2.350 piezas de PB 20/100/44

El Poliestireno Expandido PLASTOSUR (EPS) es un producto inerte, limpio y no contaminante, no desarrolla hongos ni bacterias ni se pudre. Siendo una espuma rígida de color blanco de gran trabajabilidad, caracterizada por un termoplástico celular de baja densidad y alta resistencia físico-mecánica en relación a su reducido peso aparente.

Está constituido por un sin número de celdas cerradas, solidariamente apoyadas y termo-soldadas tangencialmente entre si, las cuales contienen aire quieto ocluido en su interior. El 98% del aire quieto en su volumen es lo que le confiere una extraordinaria capacidad de aislamiento térmico.

Conductividad Térmica	*0.0430 (W / mk)*
Permeabilidad al vapor del agua	*0.018-0.036 mg / Pa.h.m²*
Resistencia Térmica	*1.10 (m²K / W)*



UNICON
Pretensados & EPS

POTOSI - BOLIVIA

POTOSI 21 DE NOVIEMBRE DEL 2025

DE: DIRECTOR DE O.
A: SUPERVISIÓN

A LA FECHA SE CONTINUA CON EL ARMADO DE VIGAS Y LOSA, HACIENDO NOTAR QUE EL DÍA DE HOY EXISTIÓ LA PRESENCIA DE PRECIPITACIONES PLUVIALES, POR LO CUAL SOLICITAMOS TOMAR EN CUENTA PARA POSIBLES AMPLIACIONES DE PLAZO.

INGENIERO CIVIL
R.N.I 20.311

Potosí 21 de Noviembre de 2025

De Supervisión
A. Dirección de obras

Se registra el presente y se instruye a la empresa documentar los hechos mediante reportes del SENAMHI

POTOSÍ 28 DE NOVIEMBRE DEL 2025

DE: DIRECTOR DE O.
A: SUPERVISIÓN

UNA VEZ CONCLUIDO EL ARMADO, DE LA LOSA SE SOLICITA LA VERIFICACIÓN DE LA MISMA, Y POSTERIOR AUTORIZACIÓN PARA PROCEDER CON LA EJECUCIÓN DEL HORMIGONADO

Potosí 28 de noviembre de 2025


De Supervisión
A Dirección de obras.

Se informa a la empresa que se realizó la verificación de la losa, instalaciones, agregados, etc. por lo que se autoriza el vaciado de la misma desde dos frentes; se recomienda cumplir a cabalidad las especificaciones, dosificaciones, y posterior curado de las estructuras

FORMULARIO A-8
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

TIEMPO DE EJECUCION: 360 DIAS CALENDARIO

Id	Nombre de tarea	Duración
1	**CONSTRUCCIÓN EDIFICIO POSTGRADO**	**360 días**
2	**M01 - # 1 OBRA GRUESA**	**360 días**
3	INSTALACIÓN DE FAENAS EDIF. POSTGRADO	6 días
4	LIMPIEZA DE ESCOMBRO POZO ZAPATA	15 días
5	REPLANTEO (ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES)	3 días
6	AMPLIACION DE PLAZO No. 1	13 días
7	EXCAVACIÓN (0-2 M.) S. SEMIDURO P/AMPLIAR ZAP	5 días
8	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA	10 días
9	BASE DE HORMIGÓN POBRE + MEJORAMIENTO SUELO	7 días
10	RELLENO Y COMPACTADO A MAQUINA	12 días
11	ACERO ESTRUCTURAL FY=5000 KG/CM2	40 días
12	HORMIGÓN SIMPLE ZAPATAS H25	45 días
13	AMPLIACION DE PLAZO No. 2	77 días
14	HORMIGÓN SIMPLE VIGAS DE FUNDACIÓN H25	15 días
15	HORMIGÓN SIMPLE COLUMNAS H25	50 días
16	VIGAS DE Hº Aº H25	90 días
17	HOSO LOSA ALIV. C/VIGUETA SIMPLE PRETEN Y PLAST H=25.	120 días
18	HORMIGÓN SIMPLE ESCALERAS H25	10 días
19	RETIRO DE ESCOMBROS C/CARGUÍO	5 días
20	LIMPIEZA GENERAL	4 días
21	**M02 - M# 2 ELECTRICO**	**27 días**
22	DUCTO PRINCIPAL DE PVC 1"	15 días
23	DUCTO PVC 3/4"	20 días
24	CAJAS CUADRADAS MET. 15X12 CM (DERIVACIÓN)	7 días
25	CAJAS OCTOGONALES PVC	5 días
26	DUCTO PRINCIPAL PVC SRD DE 4"	3 días
27	**M03 - # 3 SANITARIO**	**20 días**
28	INSTAL. TUBERÍA DE DESAGÜE PVC D=4" P/ INODOROS	7 días
29	INSTAL. TUBERÍA DE DESAGÜE PVC D=2" P/LAVAMANOS	5 días
30	INSTAL. TUBERÍA DE DESAGÜE PVC D=2" P/URINARIOS	4 días
31	INSTAL. TUBERÍA DE DESAGÜE PVC D=2" P/LAVAPLATOS Y DUCHAS	3 días
32	INSTAL. TUBERÍA DE DESAGÜE PVC D=4" P/ BAJANTE SANITARIA	3 días
33	CAJA INTERCEPTORA DE PVC 6"X20 CM.	7 días

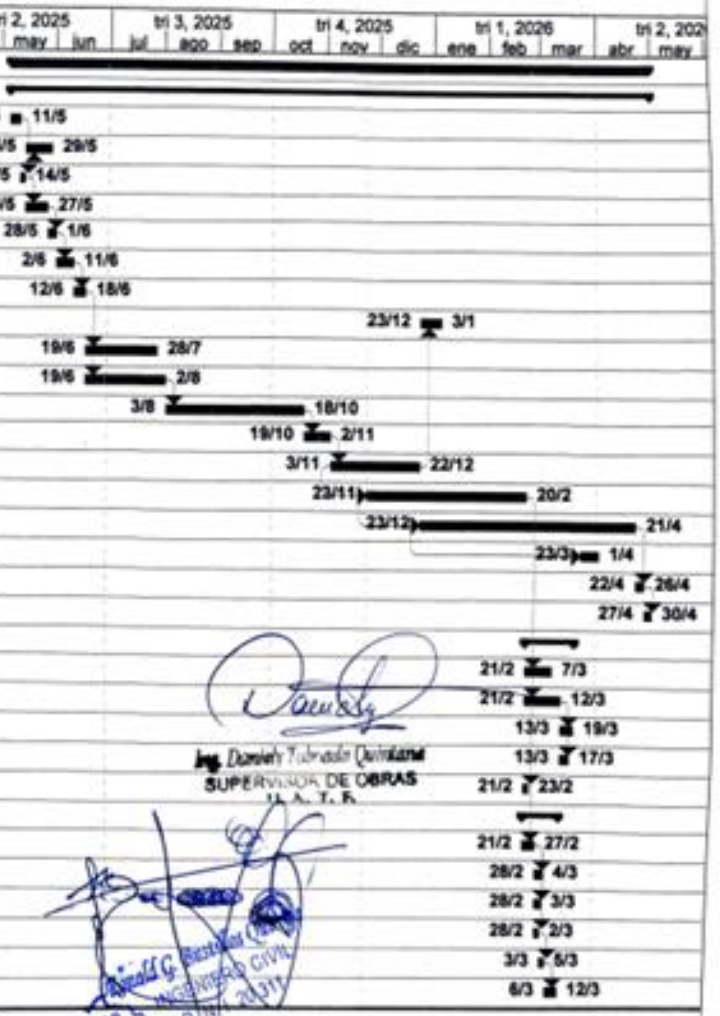

Ing. Daniela Yolanda Quintana
SUPERVISORA DE OBRAS
U.A.T.F.

DETALLE DE DESCUENTO POR AGUA POTABLE

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	DOSIFICACIÓN	TOTAL
M01 - # 1 OBRA GRUESA	0			
INSTALACIÓN DE FAENAS EDIF. POSTGRADO	Glb	1,00	0,000	0,00
LIMPIEZA DE ESCOMBRO POZO ZAPATA	Pza	56	0,000	0,00
REPLANTEO (ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES)	m^2	1326,6	0,000	0,00
EXCAVACIÓN (0-2 M.) S. SEMIDURO P/AMPLIAR ZAP	m^3	60,79	0,000	0,00
EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA	m^3	138,95	0,000	0,00
BASE DE HORMIGÓN POBRE + MEJORAMIENTO SUELO	m^3	12,06	0,018	0,21
RELLENO Y COMPACTADO A MAQUINA	m^3	641,08	0,018	11,22
ACERO ESTRUCTURAL FY=5000 KG/CM2	kg	50561,84	0,000	0,00
HORMIGÓN SIMPLE ZAPATAS H25	m^3	204,68	0,175	35,82
HORMIGÓN SIMPLE VIGAS DE FUNDACIÓN H25	m^3	28,27	0,175	4,95
HORMIGÓN SIMPLE COLUMNAS H25	m^3	134,63	0,175	23,56
VIGAS DE Hº Aº H25	m^3	85,26	0,175	14,92
HOSO LOSA ALIV. C/VIGUETA SIMPLE PRETEN Y PLAST H=25.	m^2	1109,84	0,035	38,84
HORMIGÓN SIMPLE ESCALERAS H25	m^3	0	0,175	0,00
RETIRO DE ESCOMBROS C/CARGUÍO	m^3	0	0,000	0,00
LIMPIEZA GENERAL	glb	0	0,000	0,00

Potosi 21 de Noviembre del 2025

De: Director de O.
A: Supervisión

A la fecha se continua con el armado de vigas y losa, haciendo notar que el día de hoy existió la presencia de precipitaciones pluviales, por lo cual solicitamos tomar en cuenta para posibles ampliaciones de plazo.

RNI 20311

Potosí 21 de Noviembre de 2025

De Supervisión
A. Dirección de obras

Se registra el presente y se instruye a la empresa documentar los hechos mediante reportes del SENAMHI

Potosi 28 de Noviembre del 2025

De: Director de O.
A: Supervisión

Una vez concluido el armado de la losa se solicita la verificación de la misha, y posterior autorización para proceder con la ejecución del hormigonado.

Potosí 28 de noviembre de 2025

De Supervisión
A Dirección de obras.

Se informa a la empresa que se realizó la verificación de la losa, instalaciones, agregados, etc. por lo que se autoriza el vaciado de la misma desde dos frentes; se recomienda cumplir a cabalidad las especificaciones, dosificaciones, y posterior curado de las estructuras

POTOSI 16 DE DICIEMBRE DEL 2026

DE: DIRECTOR DE O
A: SUPERVISIÓN

A LA FECHA SE TIENE ARMADAS LAS COLUMNAS DEL SEGUNDO NIVEL, POR LO CUAL SOLICITAMOS LA VERIFICACIÓN CORRESPONDIENTE Y POSTERIOR AUTORIZACION, PARA PROCEDER CON EL HORMIGONADO DEL MISMO

Potosí 16 de diciembre de 2026

De Supervisión
A Dirección de obras

Habiendo verificado las armaduras, encofrados y materiales, se autoriza a la empresa el vaciado de las mismas; tomando en cuenta para su cumplimiento de las especificaciones técnicas.

POTOSI 05 DE ENERO DEL 2026


DE: DIRECTOR DE O.
A: SUPERVISION

A LA FECHA SE PRESENTA A LA MAE UNA CARTA NOTARIADA DE INTENCIÓN DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO CONSENSUADA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO, DEBIDO A LA PROMULGACION DEL DECRETO SUPREMO Nº 5503 QUE QUITA LA SUBELCION ESTATAL A LA GASOLINA Y DIESEL, GENERANDO DE ESTA FORMA UN INCREMENTO EN EL COSTO DE LOS MATERIALES, TRANSPORTE Y MANO DE OBRA, EN TAL SENTIDO, HASTA TENER UNA RESPUESTA SOLICITAMOS LA PARALIZACION DE OBRA.

Potosí 05 de enero de 2026
De: Supervisión
A: Dirección de obras
En conocimiento de la carta notariada, se instruye a la empresa realizar el procedimiento de paralización tal cual estipula el contrato para resolución de contrato

FORMULARIO A-8
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TIEMPO DE EJECUCION: 360 DIAS CALENDARIO

Id	Nombre de tarea	Duración
1	**CONSTRUCCIÓN EDIFICIO POSTGRADO**	**360 días**
2	**M01 - # 1 OBRA GRUESA**	**360 días**
3	INSTALACIÓN DE FAENAS EDIF. POSTGRADO	6 días
4	LIMPIEZA DE ESCOMBRO POZO ZAPATA	15 días
5	REPLANTEO (ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES)	3 días
6	AMPLIACION DE PLAZO No. 1	13 días
7	EXCAVACIÓN (0-2 M.) S. SEMIDURO P/AMPLIAR ZAP	5 días
8	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA	10 días
9	BASE DE HORMIGÓN POBRE + MEJORAMIENTO SUELO	7 días
10	RELLENO Y COMPACTADO A MAQUINA	12 días
11	ACERO ESTRUCTURAL FY=5000 KG/CM2	40 días
12	HORMIGÓN SIMPLE ZAPATAS H25	45 días
13	AMPLIACION DE PLAZO No. 2	77 días
14	HORMIGÓN SIMPLE VIGAS DE FUNDACIÓN H25	15 días
15	HORMIGÓN SIMPLE COLUMNAS H25	50 días
16	VIGAS DE Hº Aº H25	90 días
17	HOSO LOSA ALIV. C/VIGUETA SIMPLE PRETEN Y PLAST H=25.	120 días
18	HORMIGÓN SIMPLE ESCALERAS H25	10 días
19	RETIRO DE ESCOMBROS C/CARGUÍO	5 días
20	LIMPIEZA GENERAL	4 días
21	**M02 - M# 2 ELECTRICO**	**27 días**
22	DUCTO PRINCIPAL DE PVC 1"	15 días
23	DUCTO PVC 3/4"	20 días
24	CAJAS CUADRADAS MET. 15X12 CM (DERIVACIÓN)	7 días
25	CAJAS OCTOGONALES PVC	5 días
26	DUCTO PRINCIPAL PVC SRD DE 4"	3 días
27	**M03 - # 3 SANITARIO**	**20 días**
28	INSTAL. TUBERÍA DE DESAGÜE PVC D=4" P/ INODOROS	7 días
29	INSTAL. TUBERÍA DE DESAGÜE PVC D=2" P/LAVAMANOS	5 días
30	INSTAL. TUBERÍA DE DESAGÜE PVC D=2" P/URINARIOS	4 días
31	INSTAL. TUBERÍA DE DESAGÜE PVC D=2" P/LAVAPLATOS Y DUCHAS	3 días
32	INSTAL. TUBERÍA DE DESAGÜE PVC D=4" P/ BAJANTE SANITARIA	3 días
33	CAJA INTERCEPTORA DE PVC 6"X20 CM.	7 días

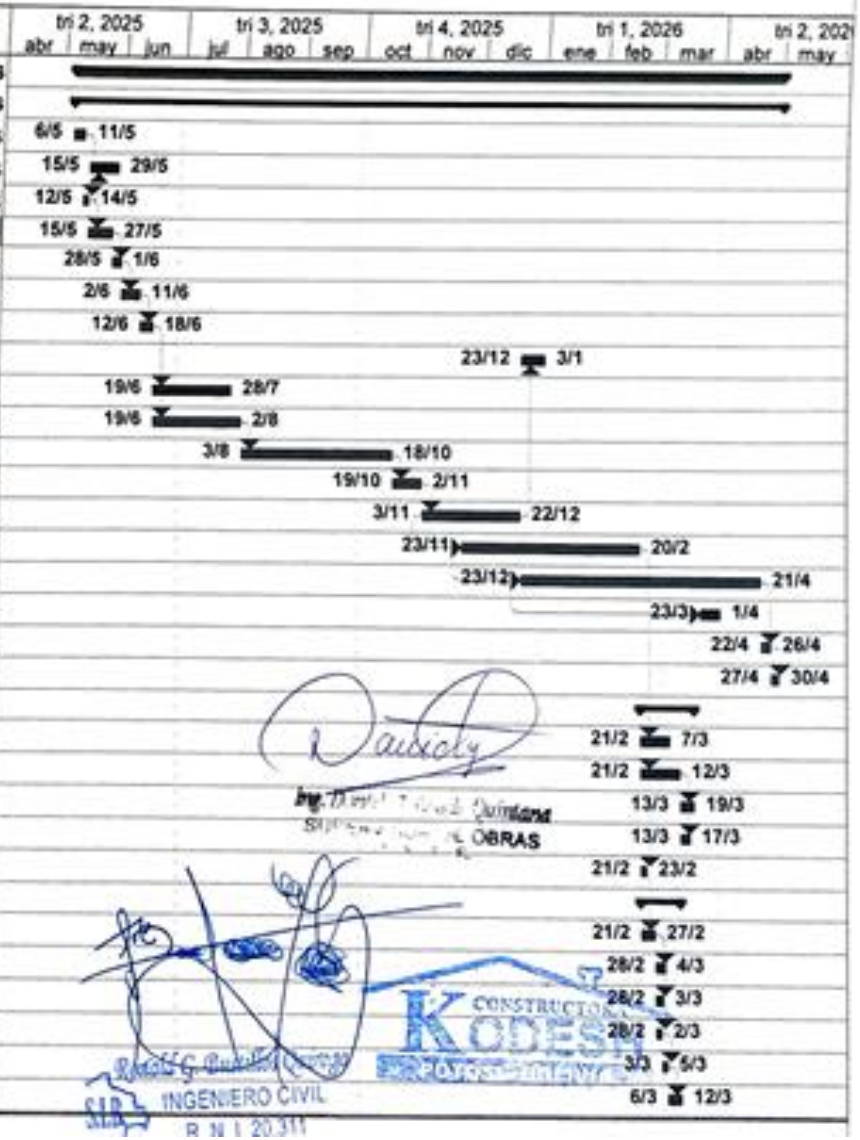

Ing. [illegible] Quintana
SUPERVISOR DE OBRAS


Rodrigo Cubillos Cuevas
INGENIERO CIVIL
R.N.I. 20.311

CONSTRUCTORA KODESH

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

FORMULARIO A-8
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TIEMPO DE EJECUCION: 283 DIAS CALENDARIO

Id	Nombre de tarea	Duración
1	**CONSTRUCCIÓN EDIFICIO POSTGRADO**	**283 días**
2	**M01 - # 1 OBRA GRUESA**	**283 días**
3	INSTALACIÓN DE FAENAS EDIF. POSTGRADO	6 días
4	LIMPIEZA DE ESCOMBRO POZO ZAPATA	15 días
5	REPLANTEO (ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES)	3 días
6	AMPLIACION DE PLAZO No. 1	13 días
7	EXCAVACIÓN (0-2 M.) S. SEMIDURO P/AMPLIAR ZAP	5 días
8	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA	10 días
9	BASE DE HORMIGÓN POBRE + MEJORAMIENTO SUELO	7 días
10	RELLENO Y COMPACTADO A MAQUINA	12 días
11	ACERO ESTRUCTURAL FY=5000 KG/CM2	40 días
12	HORMIGÓN SIMPLE ZAPATAS H25	45 días
13	HORMIGÓN SIMPLE VIGAS DE FUNDACIÓN H25	15 días
14	HORMIGÓN SIMPLE COLUMNAS H25	50 días
15	VIGAS DE Hº Aº H25	90 días
16	HOSO LOSA ALIV. C/VIGUETA SIMPLE PRETEN Y PLAST H=25.	120 días
17	HORMIGÓN SIMPLE ESCALERAS H25	10 días
18	RETIRO DE ESCOMBROS C/CARGUÍO	5 días
19	LIMPIEZA GENERAL	4 días
20	**M02 - M# 2 ELECTRICO**	**27 días**
21	DUCTO PRINCIPAL DE PVC 1"	15 días
22	DUCTO PVC 3/4"	20 días
23	CAJAS CUADRADAS MET. 15X12 CM (DERIVACIÓN)	7 días
24	CAJAS OCTOGONALES PVC	5 días
25	DUCTO PRINCIPAL PVC SRD DE 4"	3 días
26	**M03 - # 3 SANITARIO**	**20 días**
27	INSTAL. TUBERÍA DE DESAGÜE PVC D=4" P/ INODOROS	7 días
28	INSTAL. TUBERÍA DE DESAGÜE PVC D=2" P/LAVAMANOS	5 días
29	INSTAL. TUBERÍA DE DESAGÜE PVC D=2" P/URINARIOS	4 días
30	INSTAL. TUBERÍA DE DESAGÜE PVC D=2" P/LAVAPLATOS Y DUCHA	3 días
31	INSTAL. TUBERÍA DE DESAGÜE PVC D=4" P/ BAJANTE SANITARIA	3 días
32	CAJA INTERCEPTORA DE PVC 6"X20 CM.	7 días

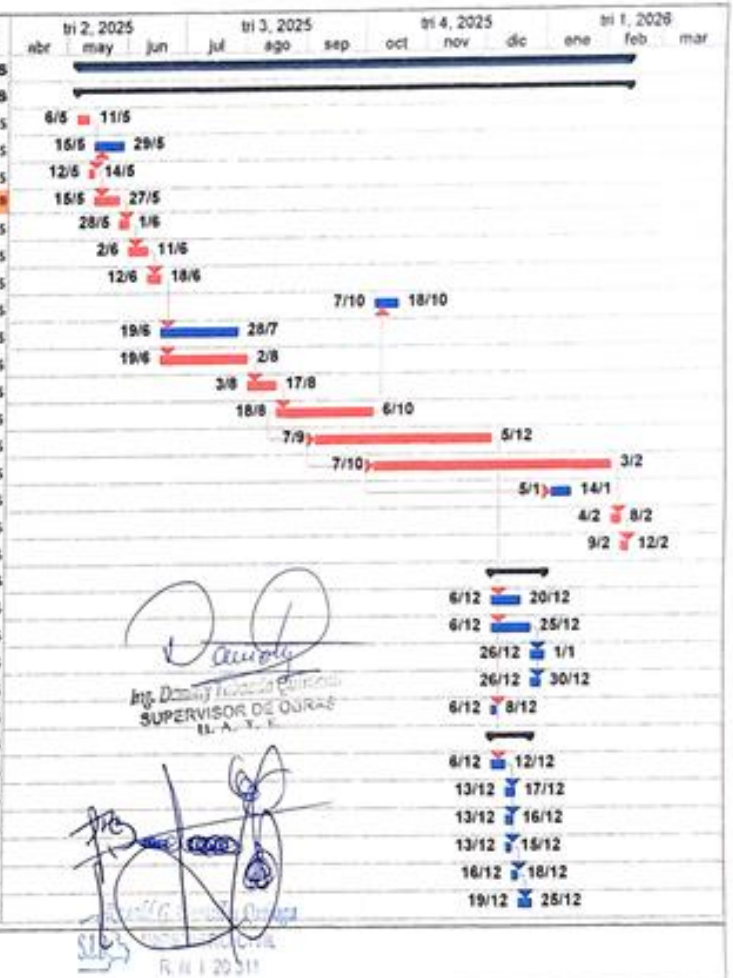

SUPERVISOR DE OBRAS

CONTRATO MODIFICATRIO Nº 1

NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCION EDIFICIO POSTGRADO
ENTIDAD CONTRATANTE	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA TOMÁS FRÍAS
EMPRESA CONTRATISTA	CONSTRUCTORA KODESH
FECHA DE INICIO	6/5/2025
PLAZO DEL CONTRATO	270 D.C.
TOTAL AMPLIACIÓN DE PLAZO	90 D.C.
FECHA DE CONCLUSIÓN	30/4/2026 D.C.

ITEM	Descripción	Unid.	P.U. INICIAL	Contrato Original		Último contrato modificado		Contrato modificatorio		Contrato Actualizado		Porcentaje modificado
				Cantidad	Precio	Cantidad	Precio	Cantidad	Precio	Cantidad	Precio	
1	INSTALACIÓN DE FAENAS EDIF. POSTGRADO	GLB	6.138,21	1,00	6.138,21	1,00	6.138,21	0,00	0,00	1,00	6.138,21	0,00%
2	LIMPIEZA DE ESCOMBRO POZO ZAPATA	PZA	208,21	48,00	9.490,08	48,00	9.490,08	10,00	2.083,10	58,00	11.573,18	0,00%
3	REPLANTEO ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES	M2	8,27	1.328,80	8.869,20	1.328,80	8.869,20	0,00	0,00	1.328,80	8.869,20	0,00%
4	EXCAVACIÓN (0-2 M.) S. SEMIDURO P/AMPLIAR ZAP	M3	71,22	156,78	11.165,28	156,78	11.165,28	-46,37	-4.838,46	82,79	4.326,79	0,00%
5	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA	M3	10,64	723,84	91.294,32	723,84	91.294,32	-664,39	-41.448,23	139,95	8.845,32	-0,00%
6	BASE DE HORMIGÓN POBRE + MEJORAMIENTO SUELO	M3	781,55	10,66	8.475,88	10,66	8.475,88	1,21	945,66	12,06	9.425,96	0,00%
7	RELLENO Y COMPACTADO A MAQUINA	M3	71,22	998,71	71.139,09	998,71	71.139,09	-207,62	-29.474,54	841,09	41.664,75	-0,01%
8	ACERO ESTRUCTURAL FY=5000 KG/CM2	KG	16,79	89.029,62	999.095,89	89.029,62	999.095,89	18.946,59	317.915,82	77.975,01	1.309.812,19	0,56%
9	HORMIGÓN SIMPLE ZAPATAS H28	M3	1.264,61	176,47	223.106,14	176,47	223.106,14	28,71	36.074,71	204,68	259.040,85	0,00%
10	HORMIGÓN SIMPLE VIGAS DE FUNDACIÓN H28	M3	1.220,99	26,94	32.892,66	26,94	32.892,66	1,35	1.623,66	28,27	34.516,77	0,00%
11	HORMIGÓN SIMPLE COLUMNAS H28	M3	2.391,75	189,19	452.498,12	189,19	452.498,12	-16,13	-38.575,31	173,06	413.917,11	0,00%
12	VIGAS DE HºAº H28	M3	2.307,82	274,17	632.991,63	274,17	632.991,63	-21,71	-50.237,59	252,45	582.444,63	0,00%
13	HOSO LOSA ALIV. C/VIGUETA SIMPLE PRETEN.Y PLAST H=25	M2	215,67	3.348,78	722.242,66	3.348,78	722.242,66	-4,21	-908,58	3.344,44	721.313,15	0,00%
14	HORMIGÓN SIMPLE ESCALERAS H28	M3	2.408,41	18,89	47.488,81	18,89	47.488,81	7,89	19.381,12	34,78	85.869,91	0,00%
15	RETIRO DE ESCOMBROS C/CARGUÍO	M3	89,82	714,00	49.894,18	714,00	49.894,18	-714,00	-49.894,18	0,00	0,00	-0,22%
16	LIMPIEZA GENERAL	GLB	2.999,99	1,00	2.999,99	1,00	2.999,99	0,00	0,00	1,00	2.999,99	0,00%
17	DUCTO PRINCIPAL DE PVC 2"	M	11,12	1.000,00	11.124,88	1.000,00	11.124,88	0,00	0,00	1.000,00	11.124,88	0,00%
18	DUCTO PVC 3/4"	M	6,22	2.000,00	18.446,84	2.000,00	18.446,84	0,00	0,00	2.000,00	18.446,84	0,00%
19	CAJAS CUADRADAS MET. 15X12 CM (DERIVACIÓN)	PZA	18,71	500,00	8.358,08	500,00	8.358,08	0,00	0,00	500,00	8.358,08	0,00%
20	CAJAS OCTOGONALES PVC	PZA	12,27	250,00	5.068,29	250,00	5.068,29	0,00	0,00	250,00	5.068,29	0,00%
21	DUCTO PRINCIPAL PVC SRD DE 4"	M	34,08	200,00	6.817,06	200,00	6.817,06	0,00	0,00	200,00	6.817,06	0,00%
22	INSTAL. TUBERIA DE DESAGÜE PVC [ø4" P/ SUMIDEROS	PTO	15,61	41,00	648,70	41,00	648,70	0,00	0,00	41,00	648,70	0,00%
23	INSTAL. TUBERIA DE DESAGÜE PVC Ø=2" P/LAVAMANOS	PTO	9,77	28,00	285,49	28,00	285,49	0,00	0,00	28,00	285,49	0,00%
24	INSTAL. TUBERIA DE DESAGÜE PVC Ø=2" P/URINARIOS	PTO	9,77	10,00	97,70	10,00	97,70	0,00	0,00	10,00	97,70	0,00%
25	INSTAL. TUBERIA DE DESAGÜE PVC Ø=2" P/LAVAPLATOS Y DUCHAS	PTO	9,77	6,00	58,63	6,00	58,63	0,00	0,00	6,00	58,63	0,00%
26	INSTAL. TUBERIA DE DESAGÜE PVC Ø=4" P/ BAJANTE SANITARIA	PTO	15,61	6,00	94,89	6,00	94,89	0,00	0,00	6,00	94,89	0,00%
27	CAJA INTERCEPTORA DE PVC 6"X30 CM.	PZA	140,52	38,00	5.339,82	38,00	5.339,82	0,00	0,00	38,00	5.339,82	0,00%
28	EXCAVACIÓN (0-2 M.) S. DURO P/AMPLIAR ZAP	M3	155,00		0,00	0,00	0,00	7,56	1.174,80	7,56	1.174,80	0,00%
29	EXCAVACIÓN (0-4 M.) S. DURO P/AMPLIAR ZAP	M3	237,84		0,00	0,00	0,00	157,99	37.487,60	157,99	37.487,60	0,00%
30	PERFORACION DE ANCLAJES EN ZAPATAS	PZA	943,90		0,00	0,00	0,00	24,00	15.429,60	24,00	15.429,60	0,00%
31	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA EN SUELO DURO	M3	113,13		0,00	0,00	0,00	222,67	24.994,67	222,67	24.994,67	0,01%

Monto Contrato Original :	Bs.
Último contrato aprobado :	Bs.
Porcentaje modificado anterior :	
Contrato modificatorio actual :	Bs.
Porcentaje modificado actual :	
Total de modificaciones :	Bs.
Porcentaje total modificado :	
Contrato modificado :	Bs.

Presentado por :

Ing. Ronald Bustillos Quiroga
DIRECTOR DE OBRA
EMPRESA CONSTRUCTORA KODESH
FECHA: 11/11/25

Revisado por :

Ing. Deniely Taboada Quintana
SUPERVISOR DE OBRA
U.A.T.F.
FECHA: 11/11/25

Validado por :

Ing. Jean Chara Chuquisea
FISCAL DE OBRA
U.A.T.F.
FECHA: 11/11/25

Validado por :

Ing. Roger Barahona Vaca
JEFE DE INFRAESTRUCTURA
U.A.T.F.
FECHA: 11/11/25

CONSTRUCTORA KODESH

Ing. Juan Chara Chuquisea

UNIVERSIDAD AUTONOMA TOMAS FRIAS
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

CONSTRUCTORA KODESH

COMPUTOS METRICOS DEMOLICIONES

Proyecto: CONSTRUCCION EDIFICIO DE POSTGRADO

Empresa Constructora: KODESH

N° de ITEMS	ACTIVIDAD	UNID.	Nro. De veces	DIMENSIONES LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	CANTIDADES PARCIALES VOLUMEN (m3)	AREA (m2)	LINEAL (m)	TOTAL
13	HOSO LOSA ALIV. C/VIGUETA SIMPLE PRETEN Y PLAST H=25.	M2								3344.74
	PRIMERA LOSA									
	AREA 1		1.00	AREA =	35.86			35.86		
	AREA 2		1.00	AREA =	34.67			34.67		
	AREA 3		1.00	AREA =	39.71			39.71		
	AREA 4		1.00	AREA =	45.97			45.97		
	AREA 5		1.00	AREA =	45.86			45.86		

UNIVERSIDAD AUTONOMA TOMAS FRIAS
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
CONSTRUCTORA KODESH
COMPUTOS METRICOS DEMOLICIONES
Proyecto: CONSTRUCCION EDIFICIO DE POSTGRADO
Empresa Constructora: KODESH

N° de ITEMS	ACTIVIDAD	UNID.	Nro. De veces	DIMENSIONES LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	CANTIDADES PARCIALES VOLUMEN (m3)	AREA (m2)	LINEAL (m)	TOTAL
13	HOSO LOSA ALIV. C/VIGUETA SIMPLE PRETEN Y PLAST H=25.	M2								
	AREA 6		1.00	AREA =	45.86			45.86		
	AREA 7		1.00	AREA =	27.68			27.68		
	AREA 8		1.00	AREA =	52.34			52.34		
	AREA 9		1.00	AREA =	4.75			4.75		
	AREA 10		1.00	AREA =	4.78			4.78		
	AREA 11		1.00	AREA =	5.15			5.15		
	AREA 12		1.00	AREA =	34.13			34.13		
	AREA 13		1.00	AREA =	13.27			13.27		
	AREA 14		1.00	AREA =	34.46			34.46		
	AREA 15		1.00	AREA =	27.48			27.48		
	AREA 16		1.00	AREA =	1.40			1.40		
	AREA 17		1.00	AREA =	34.04			34.04		
	AREA 18		1.00	AREA =	18.07			18.07		
	AREA 19		1.00	AREA =	22.48			22.48		
	AREA 20		1.00	AREA =	34.04			34.04		
	AREA 21		1.00	AREA =	33.87			33.87		
	AREA 22		1.00	AREA =	35.41			35.41		
	AREA 23		1.00	AREA =	11.98			11.98		
	AREA 24		1.00	AREA =	34.40			34.40		
	AREA 25		1.00	AREA =	33.87			33.87		
	AREA 26		1.00	AREA =	34.04			34.04		
	AREA 27		1.00	AREA =	18.05			18.05		
	AREA 28		1.00	AREA =	52.38			52.38		
	AREA 29		1.00	AREA =	4.78			4.78		
	AREA 30		1.00	AREA =	4.86			4.86		
	AREA 31		1.00	AREA =	5.17			5.17		
	AREA 32		1.00	AREA =	34.16			34.16		
	AREA 33		1.00	AREA =	13.33			13.33		
	AREA 34		1.00	AREA =	35.86			35.86		
	AREA 35		1.00	AREA =	34.67			34.67		
	AREA 36		1.00	AREA =	39.80			39.80		
	AREA 37		1.00	AREA =	10.66			10.66		
	AREA 38		1.00	AREA =	46.20			46.20		
	AREA 39		1.00	AREA =	10.65			10.65		
	AREA 40		1.00	AREA =	28.76			28.76		
	AREA 41		1.00	AREA =	25.24			25.24		
	SEGUNDA Y TERCERA LOSA							0.00		
	AREA 1		2.00	AREA =	38.11			76.22		
	AREA 2		2.00	AREA =	36.00			72.00		
	AREA 3		2.00	AREA =	39.71			79.42		
	AREA 4		2.00	AREA =	45.97			91.94		
	AREA 5		2.00	AREA =	45.86			91.72		
	AREA 6		2.00	AREA =	45.86			91.72		
	AREA 7		2.00	AREA =	27.68			55.36		

UNIVERSIDAD AUTONOMA TOMAS FRIAS
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

KODESH CONSTRUCTORA


COMPUTOS METRICOS DEMOLICIONES

Proyecto: CONSTRUCCION EDIFICIO DE POSTGRADO


Empresa Constructora: KODESH

N° de ITEMS	ACTIVIDAD	UNID.	Nro. De veces	DIMENSIONES LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	CANTIDADES PARCIALES VOLUMEN (m3)	AREA (m2)	LINEAL (m)	TOTAL
13	**HOSO LOSA ALIV. C/VIGUETA SIMPLE PRETEN Y PLAST H=25.**	**M2**								
	AREA 8		2.00	AREA =	52.34			104.68		
	AREA 9		2.00	AREA =	4.75			9.50		
	AREA 10		2.00	AREA =	4.78			9.56		
	AREA 11		2.00	AREA =	5.15			10.30		
	AREA 12		2.00	AREA =	34.13			68.26		
	AREA 13		2.00	AREA =	13.27			26.54		
	AREA 14		2.00	AREA =	34.46			68.92		
	AREA 15		2.00	AREA =	27.48			54.96		
	AREA 16		2.00	AREA =	1.40			2.80		
	AREA 17		2.00	AREA =	34.04			68.08		
	AREA 18		2.00	AREA =	18.07			36.14		
	AREA 19		2.00	AREA =	22.48			44.96		
	AREA 20		2.00	AREA =	34.04			68.08		
	AREA 21		2.00	AREA =	33.87			67.74		
	AREA 22		2.00	AREA =	35.41			70.82		
	AREA 23		2.00	AREA =	11.98			23.96		
	AREA 24		2.00	AREA =	34.40			68.80		
	AREA 25		2.00	AREA =	33.87			67.74		
	AREA 26		2.00	AREA =	34.04			68.08		
	AREA 27		2.00	AREA =	18.05			36.10		
	AREA 28		2.00	AREA =	52.38			104.76		
	AREA 29		2.00	AREA =	4.78			9.56		
	AREA 30		2.00	AREA =	4.86			9.72		
	AREA 31		2.00	AREA =	5.17			10.34		
	AREA 32		2.00	AREA =	34.16			68.32		
	AREA 33		2.00	AREA =	13.33			26.66		
	AREA 34		2.00	AREA =	38.11			76.22		
	AREA 35		2.00	AREA =	36.00			72.00		
	AREA 36		2.00	AREA =	39.80			79.60		
	AREA 37		2.00	AREA =	10.66			21.32		
	AREA 38		2.00	AREA =	46.20			92.40		
	AREA 39		2.00	AREA =	10.65			21.30		
	AREA 40		2.00	AREA =	28.76			57.52		
	AREA 41		2.00	AREA =	25.24			50.48		
										24.78
	FORMACIÓN SIMPLE ESCALERAS H25	**M3**								


GEOMETRIA SISTEMA DE EJES PRIMERA LOSA
ESC. 1a100

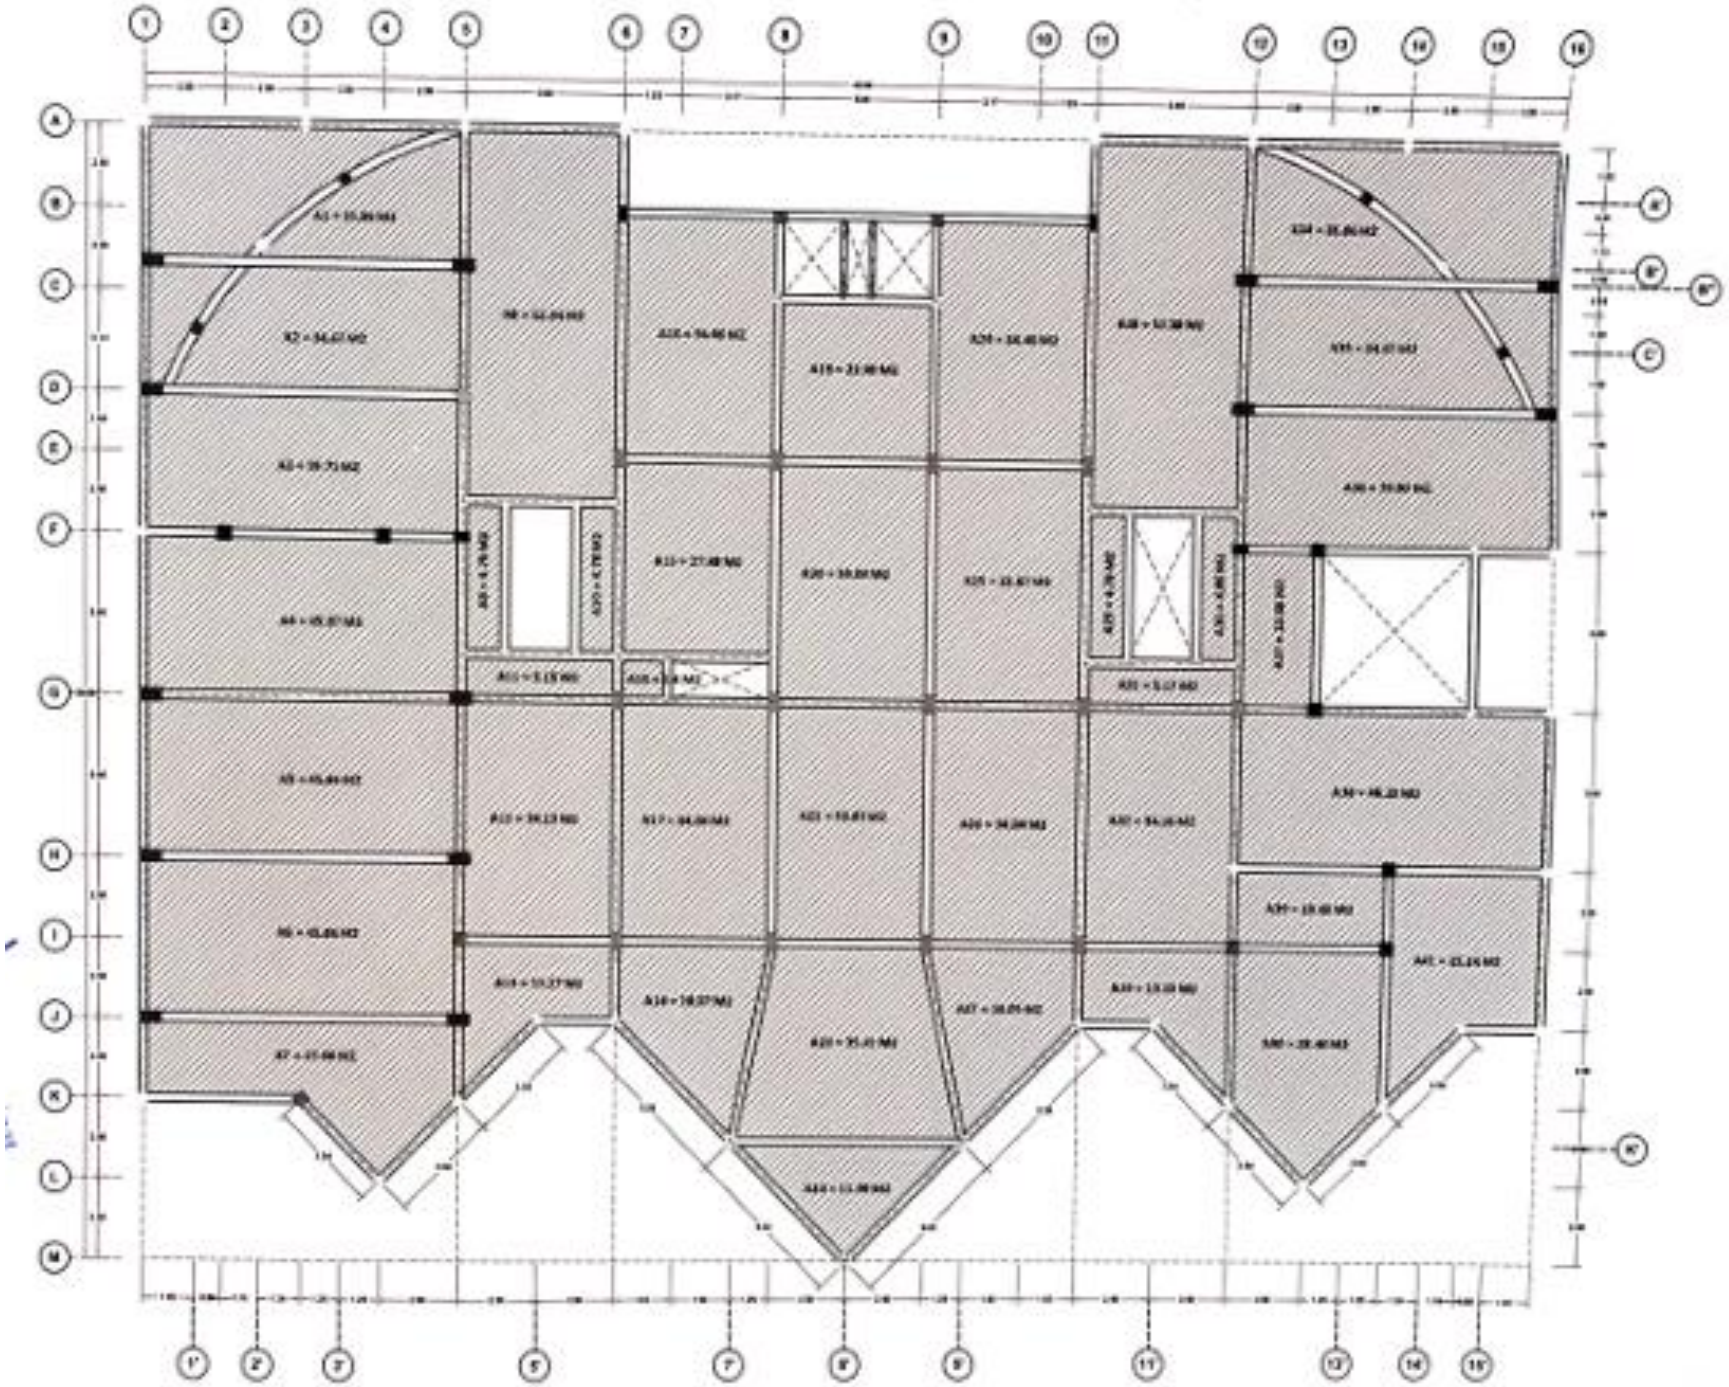


o

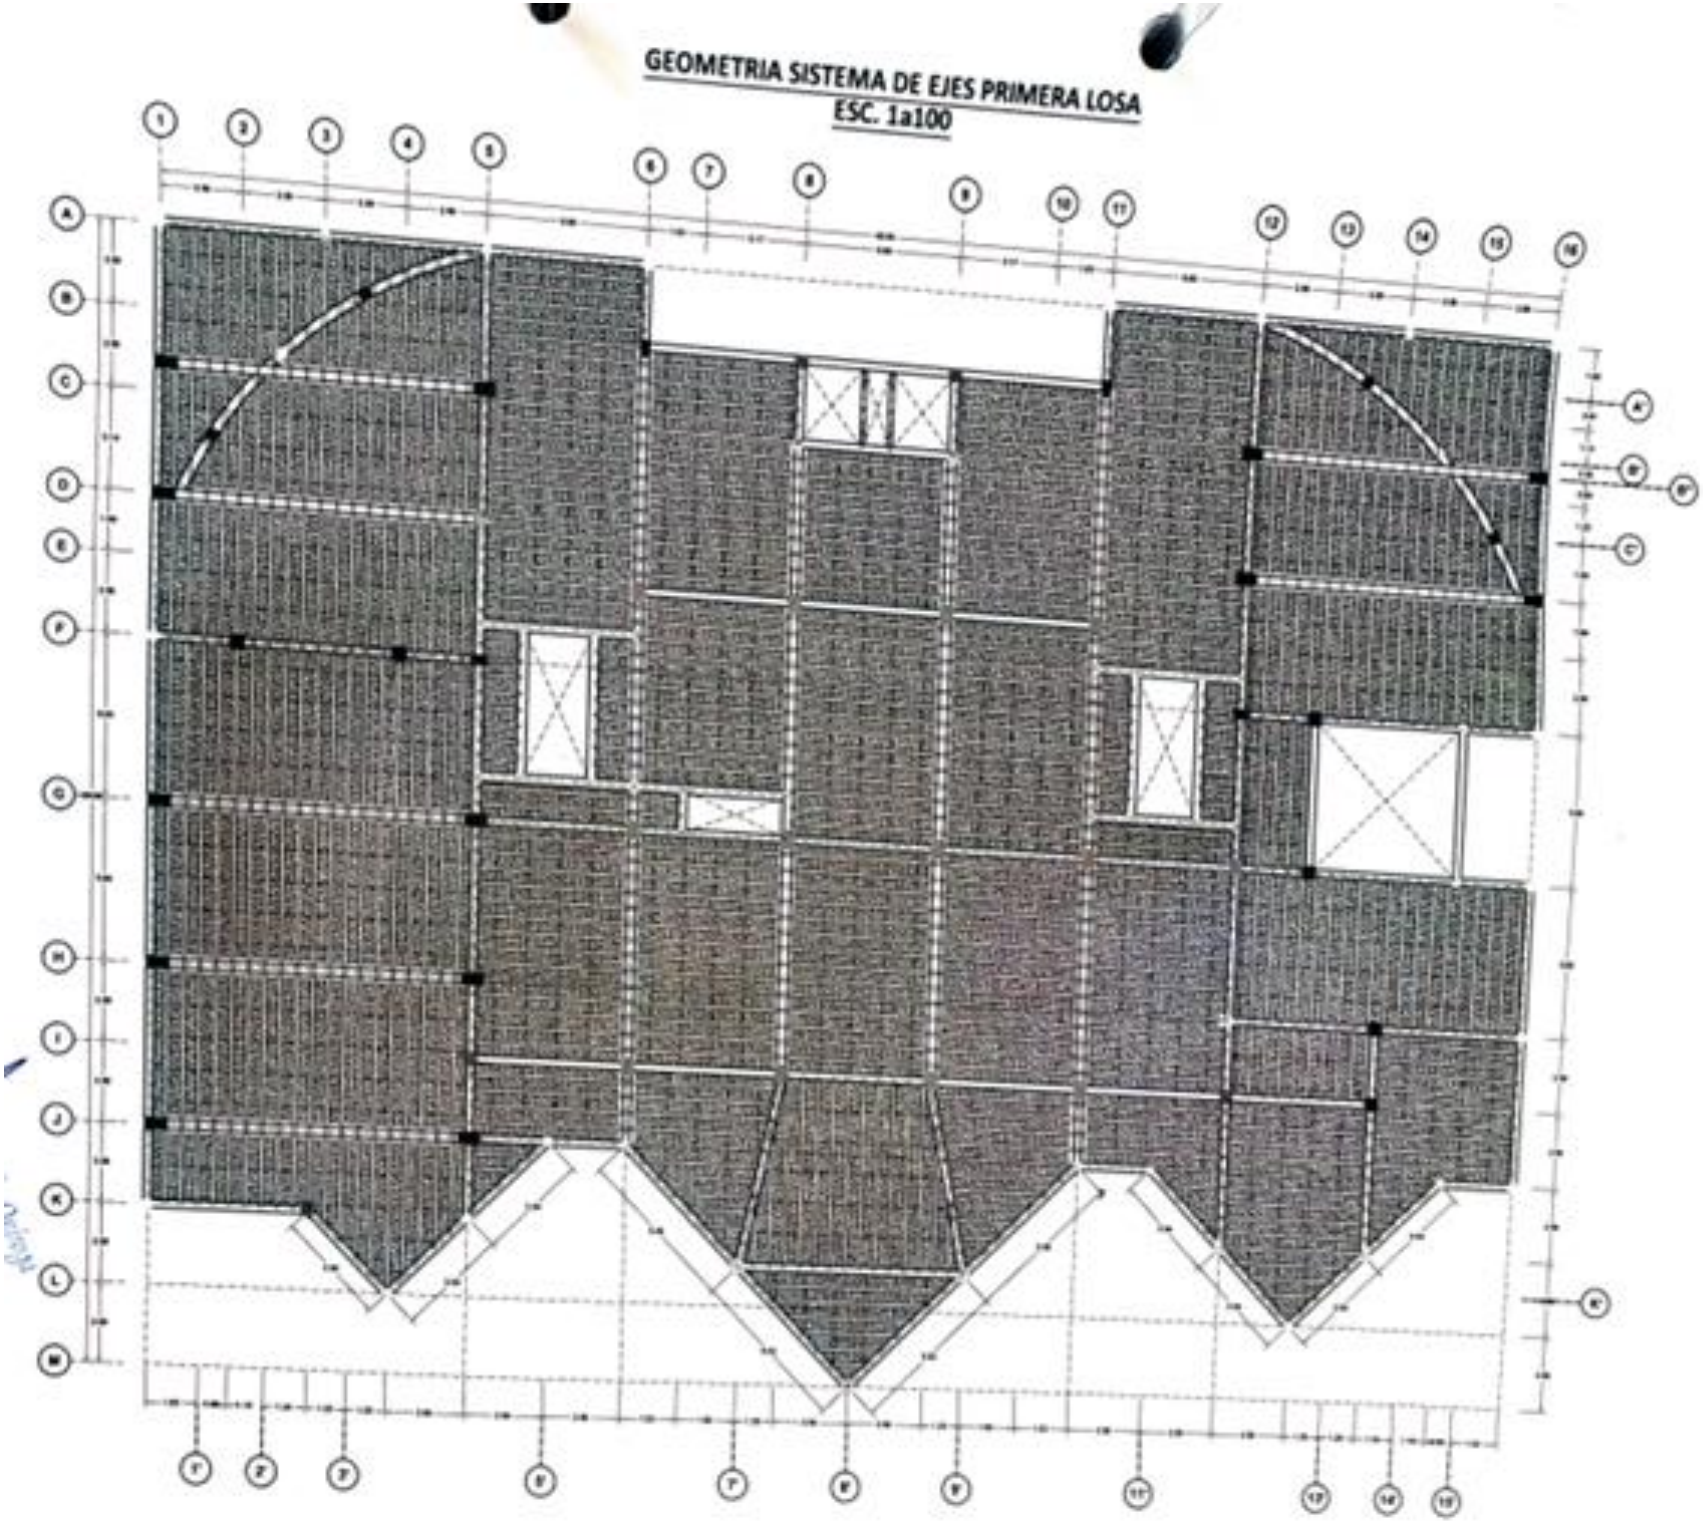

GEOMETRIA SISTEMA DE EJES PRIMERA LOSA
ESC. 1a100

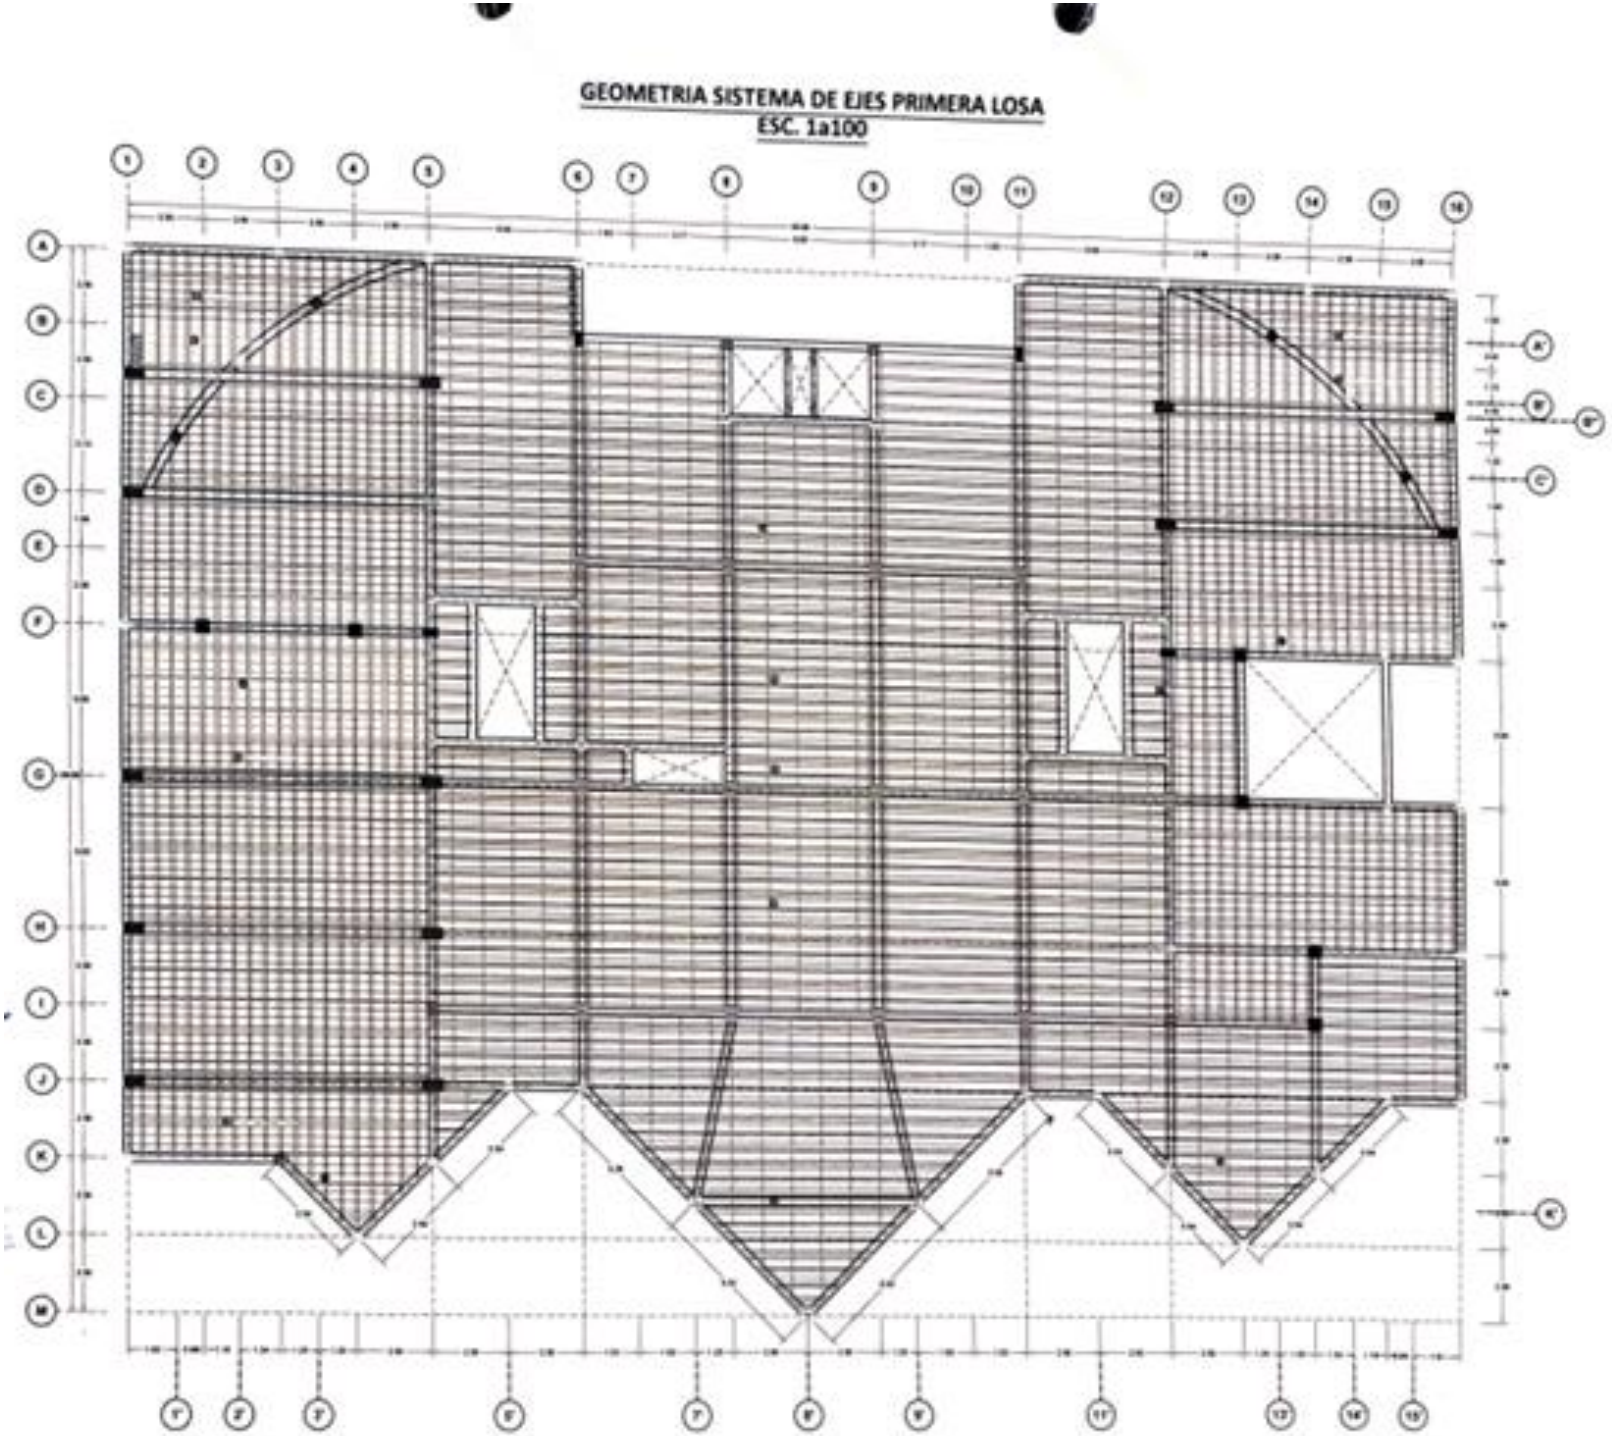


GEOMETRIA SISTEMA DE EJES PRIMERA LOSA
ESC. 1a100

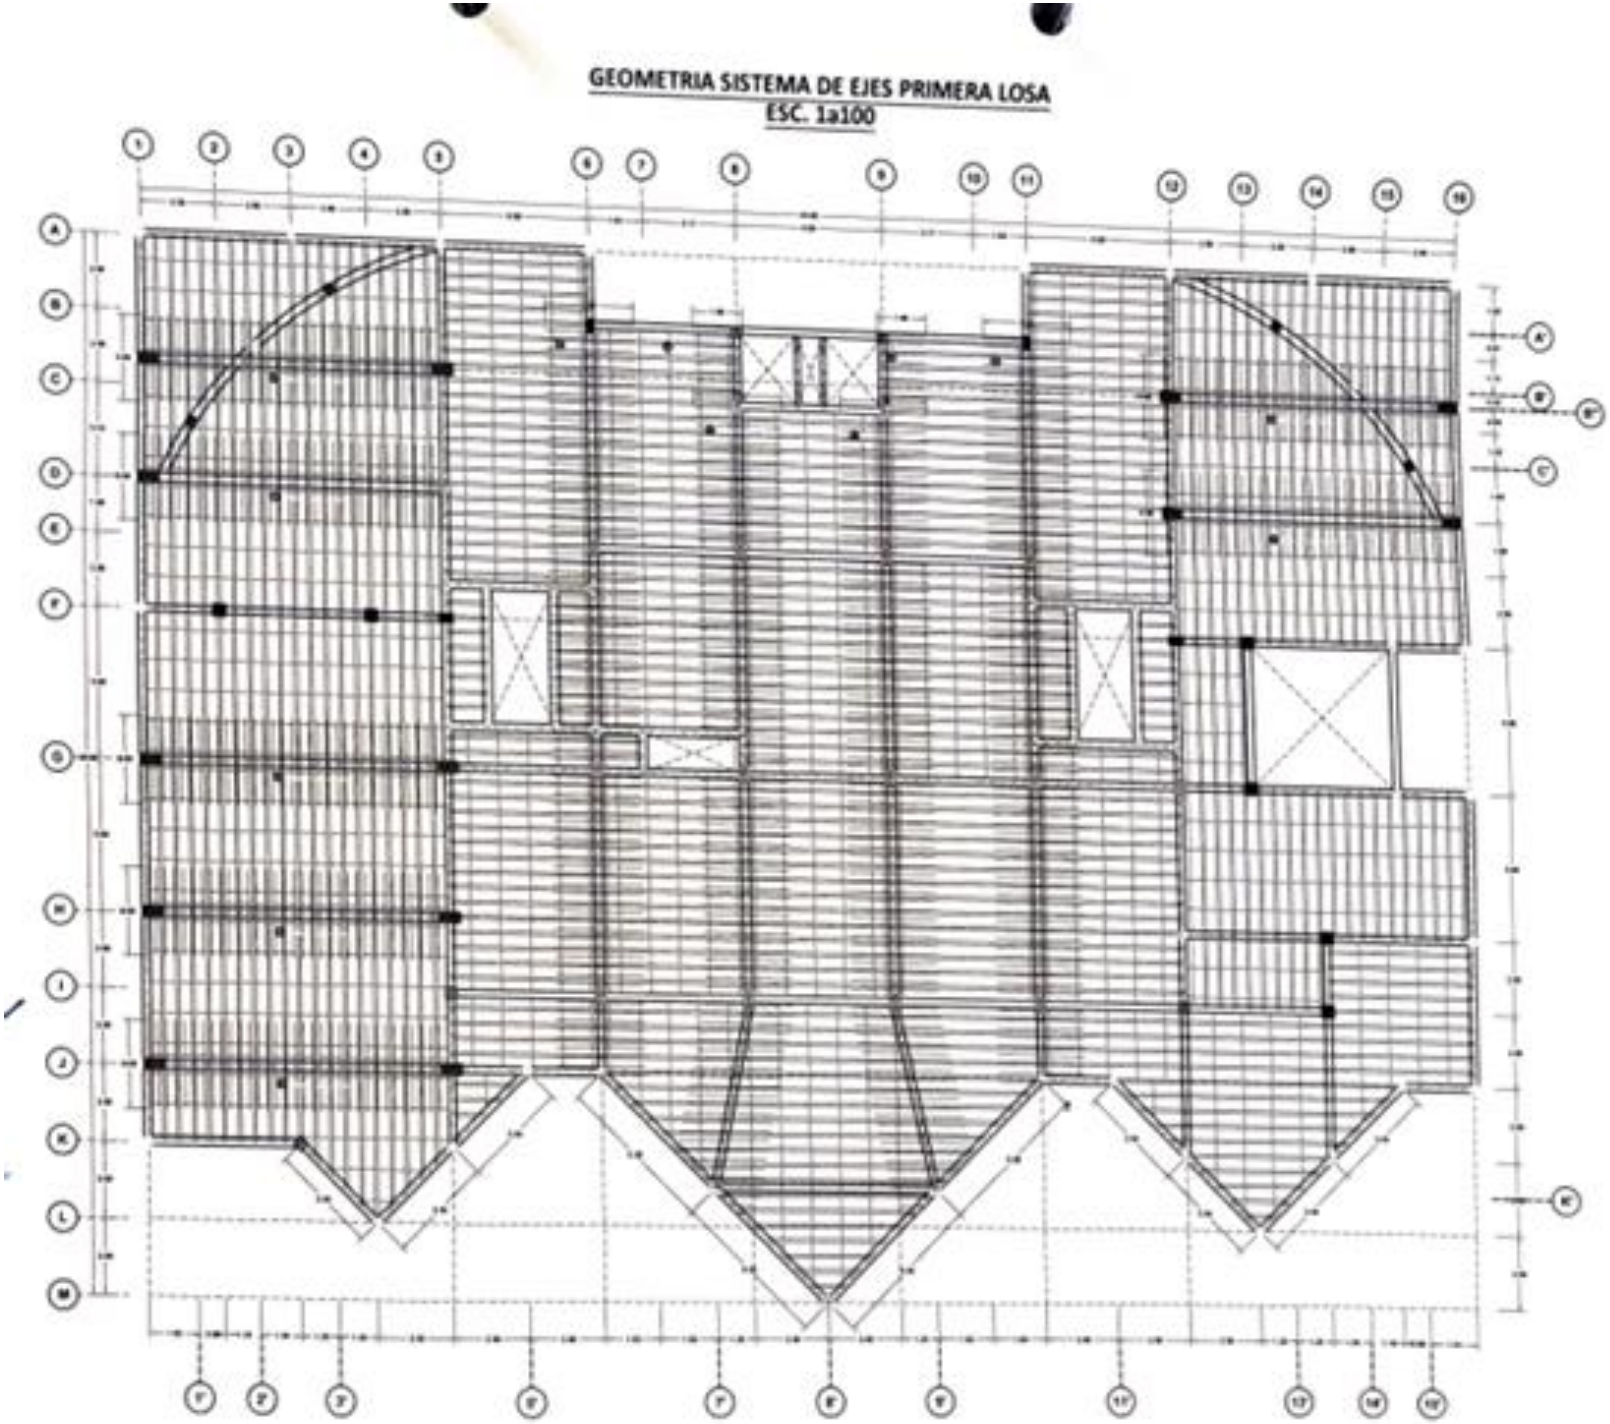

FORMULARIO A-8
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TIEMPO DE EJECUCION: 360 DIAS CALENDARIO

Id	Nombre de tarea	Duración
1	**CONSTRUCCIÓN EDIFICIO POSTGRADO**	**360 días**
2	**M01 - # 1 OBRA GRUESA**	**360 días**
3	INSTALACIÓN DE FAENAS EDIF. POSTGRADO	6 días
4	LIMPIEZA DE ESCOMBRO POZO ZAPATA	15 días
5	REPLANTEO (ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES)	3 días
6	AMPLIACION DE PLAZO No. 1	13 días
7	EXCAVACIÓN (0-2 M.) S. SEMIDURO P/AMPLIAR ZAP	5 días
8	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA	10 días
9	BASE DE HORMIGÓN POBRE + MEJORAMIENTO SUELO	7 días
10	RELLENO Y COMPACTADO A MAQUINA	12 días
11	ACERO ESTRUCTURAL FY=5000 KG/CM2	40 días
12	HORMIGÓN SIMPLE ZAPATAS H25	45 días
13	AMPLIACION DE PLAZO No. 2	77 días
14	HORMIGÓN SIMPLE VIGAS DE FUNDACIÓN H25	15 días
15	HORMIGÓN SIMPLE COLUMNAS H25	50 días
16	VIGAS DE Hº Aº H25	90 días
17	HOSO LOSA ALIV. C/VIGUETA SIMPLE PRETEN Y PLAST H=25.	120 días
18	HORMIGÓN SIMPLE ESCALERAS H25	10 días
19	RETIRO DE ESCOMBROS C/CARGUÍO	5 días
20	LIMPIEZA GENERAL	4 días
21	**M02 - M# 2 ELECTRICO**	**27 días**
22	DUCTO PRINCIPAL DE PVC 1"	15 días
23	DUCTO PVC 3/4"	20 días
24	CAJAS CUADRADAS MET. 15X12 CM (DERIVACIÓN)	7 días
25	CAJAS OCTOGONALES PVC	5 días
26	DUCTO PRINCIPAL PVC SRD DE 4"	3 días
27	**M03 - # 3 SANITARIO**	**20 días**
28	INSTAL. TUBERÍA DE DESAGÜE PVC D=4" P/ INODOROS	7 días
29	INSTAL. TUBERÍA DE DESAGÜE PVC D=2" P/LAVAMANOS	5 días
30	INSTAL. TUBERÍA DE DESAGÜE PVC D=2" P/URINARIOS	4 días
31	INSTAL. TUBERÍA DE DESAGÜE PVC D=2" P/LAVAPLATOS Y DUCHA	3 días
32	INSTAL. TUBERÍA DE DESAGÜE PVC D=4" P/ BAJANTE SANITARIA	3 días
33	CAJA INTERCEPTORA DE PVC 6"X20 CM.	7 días

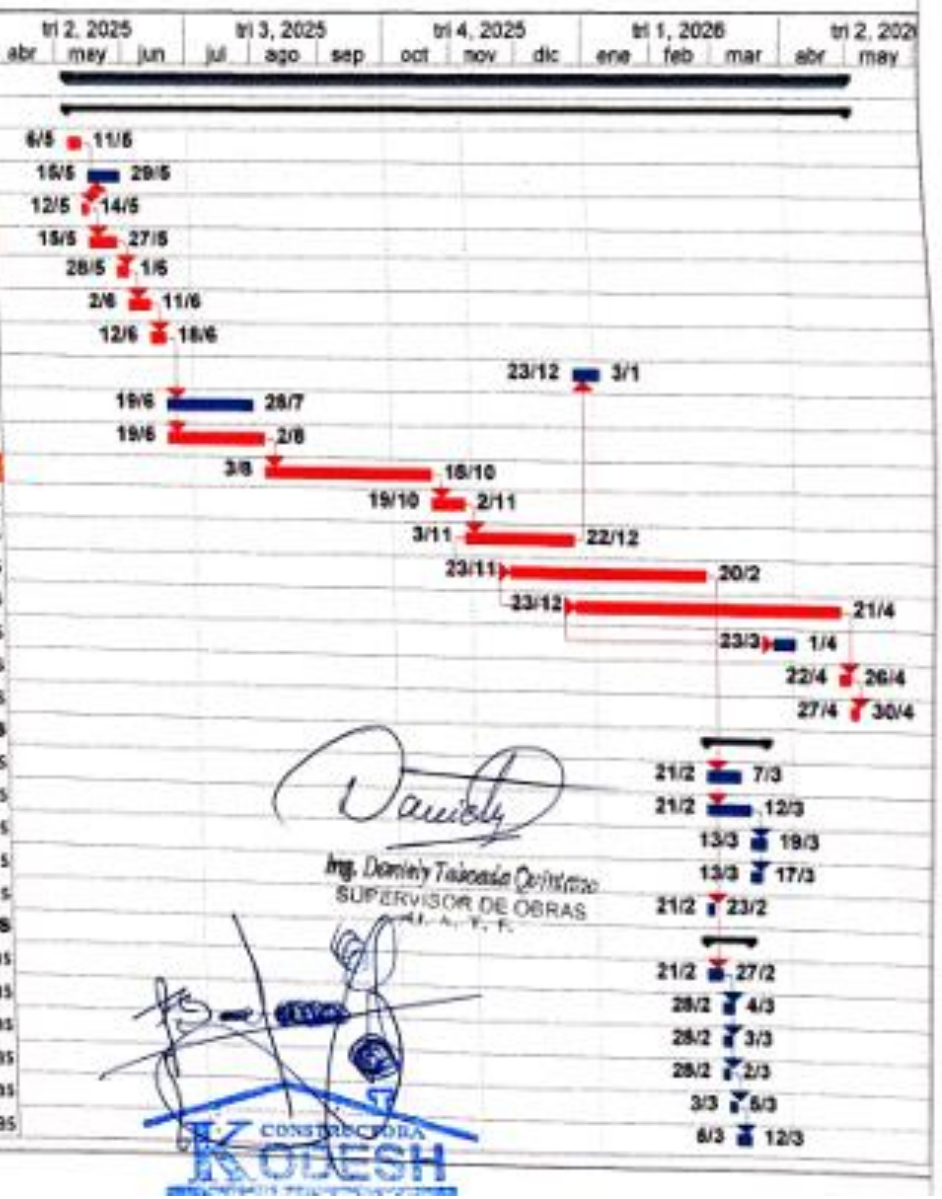

Ing. Dominik Tabacda Quintero
SUPERVISOR DE OBRAS

CONSTRUCTORA KOUESH

TABLA DE TIEMPOS EN EXCESO Y DEFECTO POR VARIACION DE VOLUMENES

No.	Item	Unid.	Cantidad Contractual (A)	Cantidad Total Autorizada (B)	Cantidad de Contrato Modificatorio (C=B-A)	TIEMPO TOTAL SEGUN CRONOGRAMA	TIEMPO SEGUN CRONOGRAMA POR UNIDAD	TIEMPO POR EXCESO Y DEFECTO (DIAS)
	M01 - # 1 OBRA GRUESA							
1	INSTALACIÓN DE FAENAS EDIF. POSTGRADO	GLB	1,00	1,00	0,00	6,00	6,000	0,00
2	LIMPIEZA DE ESCOMBRO POZO ZAPATA	PZA	46,00	56,00	10,00	15,00	0,326	3,26
3	REPLANTEO (ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES)	M2	1.326,60	1.326,60	0,00	3,00	0,002	0,00
4	EXCAVACIÓN (0-2 M.) S. SEMIDURO P/AMPLIAR ZAP	M3	156,76	60,79	-95,97	5,00	0,032	-3,06
5	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA	M3	723,94	138,95	-584,99	10,00	0,014	-8,08
6	BASE DE HORMIGÓN POBRE + MEJORAMIENTO SUELO	M3	10,85	12,06	1,21	7,00	0,645	0,78
7	RELLENO Y COMPACTADO A MAQUINA	M3	998,71	641,08	-357,63	12,00	0,012	-4,30
8	ACERO ESTRUCTURAL FY=5000 KG/CM2	KG	59.029,92	85.777,46	26.747,54	40,00	0,001	18,12
9	HORMIGÓN SIMPLE ZAPATAS H25	M3	176,47	204,68	28,21	45,00	0,255	7,19
10	HORMIGÓN SIMPLE VIGAS DE FUNDACIÓN H25	M3	26,94	28,27	1,33	15,00	0,557	0,74
11	HORMIGÓN SIMPLE COLUMNAS H25	M3	189,19	173,06	-16,13	50,00	0,264	-4,26
12	VIGAS DE HºAº H25	M3	274,17	252,40	-21,77	90,00	0,328	-7,15
13	HOSO LOSA ALIV. C/VIGUETA SIMPLE PRETEN Y PLAST H=25.	M2	3.348,75	3.344,74	-4,01	120,00	0,036	-0,14
14	HORMIGÓN SIMPLE ESCALERAS H25	M3	16,89	24,78	7,89	10,00	0,592	4,67
15	RETIRO DE ESCOMBROS C/CARGUÍO	M3	714,00	0,00	-714,00	5,00	0,007	-5,00
16	LIMPIEZA GENERAL	GLB	1,00	1,00	0,00	4,00	4,000	0,00
							TOTAL DIAS =	2,78

POR LO TANTO EL TIEMPO ADICIONAL POR VARIACION DE VOLÚMENES ES:

TOTAL DIAS = 2,78

POR LO TANTO EL TIEMPO ADICIONAL POR VARIACION DE VOLÚMENES ES:

TIEMPO TOTAL POR VARIACION DE VOLUMENES = 3 DIAS

TABLA DE TIEMPOS ADICIONALES POR ACTIVIDADES NUEVAS


No.	Item	Unid.	Cantidad Contractual (A)	Cantidad Total Autorizada (B)	Cantidad de Contrato Modificatorio (C=B-A)	RENDIMIENTO MANO DE OBRA (HR.)	RENDIMIENTO MANO DE OBRA (DIA)	TIEMPO POR EXCESO Y DEFECTO (DIAS)
	ITEMS NUEVOS							
1	EXCAVACIÓN (0-2 M.) S. DURO P/AMPLIAR ZAP	M3		7,58	7,58	2,25	0,28	2,13
2	EXCAVACIÓN (0-4 M.) S. DURO P/AMPLIAR ZAP	M3		157,95	157,95	3,00	0,38	59,23
3	PERFORACION DE ANCLAJES EN ZAPATAS	PZA		24,00	24,00	2,50	0,31	7,50
4	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA EN SUELO DURO	M3		222,87	222,87	0,18	0,02	4,88
							TOTAL DIAS =	73,74

POR LO TANTO EL TIEMPO ADICIONAL POR ITEMS NUEVOS ES:

TIEMPO TOTAL POR ITEMS NUEVOS = 74

POR LO TANTO EL TIEMPO TOTAL ES:

TIEMPO TOTAL ADICIONAL = 77



COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

La Fábrica Nacional de Cemento S.A. informa a sus clientes y a la población en general que la difícil situación económica, política y social que atraviesa el país está teniendo un impacto negativo en las actividades productivas y comerciales de nuestra Empresa.

Como consecuencia de este complejo escenario, nos enfrentamos actualmente a una severa restricción en el suministro de diésel, elemento fundamental para el funcionamiento de nuestros equipos de producción y para el transporte del cemento. Esta limitación nos obliga, de manera lamentable e inevitable, a paralizar temporalmente nuestras operaciones productivas a partir de las próximas horas.

FANCESA expresa sus más sinceras disculpas a todos sus clientes y aliados estratégicos por los inconvenientes que esta situación pueda generar. Aseguramos que, una vez se restablezca el suministro normal de combustible, reanudaremos inmediatamente nuestras operaciones y cumpliremos con todos los compromisos comerciales previamente acordados.

Agradecemos la comprensión de todos en estos momentos difíciles y reafirmamos nuestro compromiso con la industria, el desarrollo del país y el bienestar de la población.

Sucre, 12 de junio de 2025

FANCESA 66

CADECO
TARIJA

PRONUNCIAMIENTO
SOBRE EL INCREMENTO DEL PRECIO DEL CEMENTO

La Cámara de la Construcción de Tarija, manifiesta su profunda preocupación ante el constante incremento del precio del cemento en nuestro país.

Siendo este uno de los principales materiales de construcción utilizados en los diferentes proyectos de infraestructura, ocasionará la paralización de obras y un grave perjuicio a las empresas constructoras, considerando que la normativa nacional en actual vigencia, no permite a las entidades contratantes realizar un reajuste de precios.

Éste difícil panorama sumado a la escasez de combustibles, incremento de los precios de los materiales nacionales e importados, retraso en el pago de panillas de avance de obras, escasez e incremento del tipo de cambio del dólar entre otros factores, agudiza aún más la situación del sector, que a pesar de la difícil coyuntura por la que se viene atravesando, continúa generando trabajo, movimiento económico y poniendo el hombro al desarrollo del país.

Por lo señalado, hacemos un llamado urgente a las autoridades del gobierno nacional para que puedan realizar un diálogo sincero con las industrias cementeras del país para evitar la especulación y un incremento desmedido del precio del producto.

Por otra parte, se trabaje inmediatamente en la modificación de los decretos supremos 5321 y 5452 de reajuste de precios, ampliando su plazo de vigencia e incorporando a la lista de materiales al cemento y otros productos de procedencia nacional y extranjera.

En caso no se tomen medidas urgentes, no solo la cadena de la industria de la construcción será la afectada, sino también lo sectores relacionados y la población en general.

Tarija, 09 de octubre de 2025

LAS LOMAS
PRIMERA SIDERÚRGICA BOLIVIANA

OEA

Potosí, 16 de junio del 2025
CTT/PTS LL - 11/2025

Estimados señores:

EMPRESA CONSTRUCTORA KODESH

Reciban un cordial saludo de IMPORT EXPORT LAS LOMAS LTDA.

Les escribimos en referencia a su adquisición de material de fierro corrugado 20 toneladas, de fecha 9 de mayo, pedido Nº 21246813 Factura Nº 15324 para el proyecto de construcción del edificio de Postgrado

Atendiendo su 1er requerimiento de material de 4 de junio de 2025. Para el día de hoy 16 de junio se completó la entrega del saldo pendiente de su primera requerimiento del material. Se logró entregar parcialmente el 30% de su compra.

El motivo por la demora por la entrega del restante se debe a la coyuntura actual que atraviesa nuestro país, la cual ha provocado el desabastecimiento de combustibles y bloqueos de carreteras que han afectado significativamente la circulación de vehículos ya que nuestra siderúrgica se encuentra ubicada en el departamento de Santa Cruz en Buena Vista carretera a Cochabamba.

Agradecemos de antemano su comprensión.


Atentamente,

Ing. Victor Maldonado Rodas
Jefe de Sucursal
Las Lomas Potosí

IMPORT - EXP
LAS LOMAS LTDA
NIT: 102844 3027
Av. Las Banderas Nº 125
Telf. 62 - 47356

FORMULARIO A-8
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TIEMPO DE EJECUCION: 360 DIAS CALENDARIO

Id	Nombre de tarea	Duración
1	**CONSTRUCCIÓN EDIFICIO POSTGRADO**	**360 días**
2	**M01 - # 1 OBRA GRUESA**	**360 días**
3	INSTALACIÓN DE FAENAS EDIF. POSTGRADO	6 días
4	LIMPIEZA DE ESCOMBRO POZO ZAPATA	15 días
5	REPLANTEO (ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES)	3 días
6	AMPLIACION DE PLAZO No. 1	13 días
7	EXCAVACIÓN (0-2 M.) S. SEMIDURO P/AMPLIAR ZAP	5 días
8	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA	10 días
9	BASE DE HORMIGÓN POBRE + MEJORAMIENTO SUELO	7 días
10	RELLENO Y COMPACTADO A MAQUINA	12 días
11	ACERO ESTRUCTURAL FY=5000 KG/CM2	40 días
12	HORMIGÓN SIMPLE ZAPATAS H25	45 días
13	AMPLIACION DE PLAZO No. 2	77 días
14	HORMIGÓN SIMPLE VIGAS DE FUNDACIÓN H25	15 días
15	HORMIGÓN SIMPLE COLUMNAS H25	50 días
16	VIGAS DE Hº Aº H25	90 días
17	HOSO LOSA ALIV. C/VIGUETA SIMPLE PRETEN Y PLAST H=25.	120 días
18	HORMIGÓN SIMPLE ESCALERAS H25	10 días
19	RETIRO DE ESCOMBROS C/CARGUÍO	5 días
20	LIMPIEZA GENERAL	4 días
21	**M02 - M# 2 ELECTRICO**	**27 días**
22	DUCTO PRINCIPAL DE PVC 1"	15 días
23	DUCTO PVC 3/4"	20 días
24	CAJAS CUADRADAS MET. 15X12 CM (DERIVACIÓN)	7 días
25	CAJAS OCTOGONALES PVC	5 días
26	DUCTO PRINCIPAL PVC SRD DE 4"	3 días
27	**M03 - # 3 SANITARIO**	**20 días**
28	INSTAL. TUBERÍA DE DESAGÜE PVC D=4" P/ INODOROS	7 días
29	INSTAL. TUBERÍA DE DESAGÜE PVC D=2" P/LAVAMANOS	5 días
30	INSTAL. TUBERÍA DE DESAGÜE PVC D=2" P/URINARIOS	4 días
31	INSTAL. TUBERÍA DE DESAGÜE PVC D=2" P/LAVAPLATOS Y DUCHA	3 días
32	INSTAL. TUBERÍA DE DESAGÜE PVC D=4" P/ BAJANTE SANITARIA	3 días
33	CAJA INTERCEPTORA DE PVC 6"X20 CM.	7 días

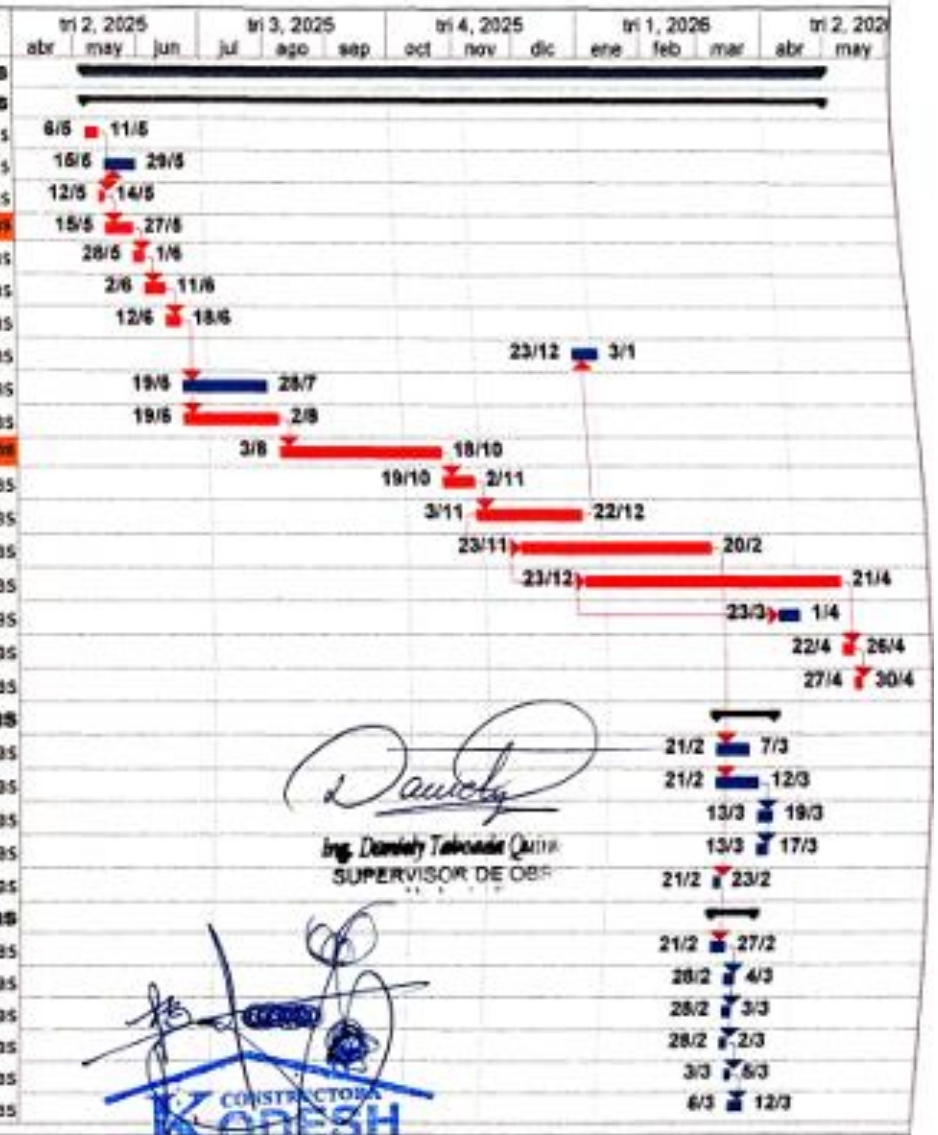

Ing. Daniely Talavera Quiroz
SUPERVISOR DE OBR

CONSTRUCTORA KODESH
