26.4 **Conformidad de la obra con los planos:** Todos los trabajos ejecutados, deberán en todos los casos, estar de acuerdo con los detalles indicados en los planos, excepto en los casos dispuestos de otro modo por escrito por la SUPERVISIÓN.

26.5 **Trabajos topográficos**

Consiste en la ejecución de todos los trabajos topográficas destinados a la ejecución, medición y verificación de los trabajos de construcción de la obra, así como en la preservación, conservación y reposición de los mojones, estacas u otros elementos que sirven de referencia planimétrica o altimétrica del diseño de la obra.

La SUPERVISIÓN procederá a la ejecución y control de los trabajos topográficos iniciales consistentes en el replanteo de ejes, nivelación y levantamientos, que servirán de base para la elaboración de órdenes de trabajo.

Los trabajos topográficos serán considerados como una obligación subsidiaria a la ejecución del contrato por parte del CONTRATISTA, por lo tanto, su costo está considerado en los precios unitarios contractuales de los ítems de obra que lo utilizan, por lo que, el CONTRATISTA está obligado a realizar los trabajos topográficos necesarios para la ejecución de las actividades que así lo ameriten, en caso de divergencia con el SUPERVISOR, el FISCAL DE OBRA definirá la alternativa correcta.

26.6 **Inspección de la calidad de los materiales.** Todos los materiales a ser utilizados en la Obra deberán cumplir estrictamente con las Especificaciones Técnicas pertinentes y estarán sujetos a inspección, examen y ensayos dispuestos por la SUPERVISIÓN en cualquier momento y en los lugares de producción y/o utilización en la obra, antes de su incorporación a la misma. Los costos para la realización de ensayos están a cargo del CONTRATISTA.

26.7 **Suministro de materiales, fuentes de origen.** El CONTRATISTA deberá proveer todos los materiales *requeridos para la realización del Contrato, de fuentes de su elección. Todos los materiales deberán* llenar las exigencias de las Especificaciones Técnicas y el CONTRATISTA deberá cerciorarse personalmente en forma satisfactoria con respecto a la clase y volumen de trabajo que pueda ser necesario para el aprovisionamiento y transporte de dicho material. Este costo deberá estar considerado en el cálculo del precio unitario del ítem correspondiente.

26.8 **Cumplimiento de Especificaciones Técnicas.** Es responsabilidad del CONTRATISTA cumplir con las especificaciones técnicas del Contrato en cualquier fase de los trabajos, garantizando la correcta ejecución de la OBRA.

26.9 **Almacenamiento y acopio de materiales.** Los materiales de construcción deberán acopiarse en zonas limpias y aprobadas por la SUPERVISIÓN, de tal forma que se asegure la preservación, calidad y aceptabilidad para la OBRA. Los materiales almacenados, serán inspeccionados y aprobados por la SUPERVISIÓN antes de su uso en la Obra, para verificar si cumplen los requisitos especificados en el momento de ser utilizados.

Cuando se haya completado la utilización del material acumulado, el sitio de almacenamiento de materiales o superficie del terreno natural deberá ser reacondicionada en la mejor forma posible para que ésta pueda recuperar su condición original, corriendo los gastos por cuenta del CONTRATISTA.

26.10 Inspección de la calidad de los trabajos

a) La SUPERVISIÓN ejercerá la inspección y control permanente en campo, exigiendo el cumplimiento de las especificaciones técnicas, en todas las fases del trabajo y en toda o cualquier parte de la obra.
b) El CONTRATISTA deberá proporcionar rápidamente y sin cargo adicional alguno, todas las facilidades razonables, mano de obra y materiales necesarios para las inspecciones y ensayos que serán efectuados, de tal manera que no se demore innecesariamente el trabajo.
c) La SUPERVISIÓN estará autorizada para llamar la atención del CONTRATISTA sobre cualquier discordancia del trabajo con los planos o especificaciones, para suspender todo trabajo mal ejecutado y rechazar material defectuoso. Las instrucciones u observaciones verbales de la SUPERVISIÓN deberán

De no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro del plazo previsto, los días de demora serán contabilizados por el SUPERVISOR y/o el FISCAL, a efectos de deducir los mismos del lapso que la ENTIDAD en su caso pueda demorar en ejecutar el pago de la citada planilla.

El SUPERVISOR, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, después de recibir en versión definitiva el certificado o planilla de pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado, con la nueva fecha.

El certificado aprobado por el SUPERVISOR, con la fecha de aprobación, será remitido al FISCAL DE OBRA, quien luego de tomar conocimiento del mismo, dentro del término de tres (3) días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo enviará a la dependencia pertinente de la ENTIDAD para el pago, con la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro *del plazo máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción.*

En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISOR, para correcciones o aclaraciones, el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir los documentos nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCAL DE OBRA.

El pago de cada certificado o planilla mensual de avance de obra se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago. El CONTRATISTA, recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen.

Si el pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizara dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario computables a partir de la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago; el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar por el lapso transcurrido desde el día cuarenta y seis (46) hasta el día en que se haga efectivo el pago, la ampliación de plazo por día de atraso.

Si en ese lapso, el pago que se realiza es parcial, el CONTRATISTA podrá reclamar la compensación en tiempo por similar porcentaje a la falta de pago.

Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) calendario, computables a partir de la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, el CONTRATISTA tiene el derecho de reclamar el *pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, por el monto no pagado,* valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días y multiplicándola por el número de días de retraso que incurra la ENTIDAD, como compensación económica, independiente del plazo.

En caso de que se hubiese pagado parcialmente la planilla o certificado de avance de obra, el reclamo corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado.

A este fin el CONTRATISTA deberá hacer conocer a la ENTIDAD la demora en el pago, mediante nota dirigida al SUPERVISOR dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a la fecha de haberse hecho efectivo el pago parcial o total de la planilla, quien pondrá de inmediato a conocimiento de la ENTIDAD, para que disponga el pago del monto resultante de esta demora y establezca las causas para que asuma los ajustes correspondientes a los efectos de las responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan.

En cada caso, el Informe del SUPERVISOR consignará también la deducción de los días de demora en la presentación de la planilla en que en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTA.

En caso de que el CONTRATISTA, no presente al SUPERVISOR la respectiva planilla de avance de obra hasta treinta (30) días posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el SUPERVISOR deberá elaborar la planilla en base a los datos de la medición que tuvo que efectuar en forma conjunta con el CONTRATISTA y la enviará a este para la firma del DIRECTOR, con la respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual, *advirtiéndole de las implicaciones posteriores de esta omisión. El procedimiento subsiguiente de pago a ser* aplicado, será el establecido precedentemente.

VIGÉSIMA NOVENA.- (FACTURACIÓN).

El CONTRATISTA emitirá la factura correspondiente a favor de la ENTIDAD una vez que cada planilla de avance de obra haya sido aprobada por el SUPERVISOR. En caso de que no sea emitida la factura respectiva, la ENTIDAD no hará efectivo el pago de la planilla.

TRIGÉSIMA.- (MODIFICACIÓN DE LAS OBRAS).

30.1 La modificación de obras objeto del presente Contrato podrá efectuarse siempre que se sujete a la aplicación del Artículo 89 del Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y cuando no afecten la esencia del presente Contrato.

30.2 En el marco legal citado precedentemente, queda establecido que de forma excepcional, por causas plenamente justificadas (técnica, legal y financiera), el SUPERVISOR, con la autorización expresa de la ENTIDAD, durante el período de ejecución de la obra, podrá efectuar modificaciones y/o ajustes necesarios al diseño de la obra, (que modifiquen el plazo o el monto de la obra), a efectos que la misma cumpla con el fin previsto.

30.3 El SUPERVISOR, previo el trámite respectivo de aprobación podrá introducir modificaciones que consideren estrictamente necesarias y con tal propósito, tendrá la facultad para ordenar por escrito al CONTRATISTA y éste deberá cumplir con cualquiera de las siguientes instrucciones:

a) Efectuar ajustes de rutina o especiales en el desarrollo cotidiano de la obra.
b) Incrementar o disminuir cualquier parte de la obra prevista en el Contrato.
c) Ejecutar trabajos adicionales inherentes a la misma obra, que sean absolutamente necesarios, aunque no cuenten con precios unitarios establecidos en el Contrato.

30.4. El SUPERVISOR con conocimiento de la ENTIDAD, puede ordenar las modificaciones a través de los siguientes instrumentos:

a) **Mediante una Orden de Trabajo:** Cuando la modificación esté referida a un ajuste o redistribución de cantidades de obra, sin que ello signifique cambio sustancial en el diseño de la obra, en las condiciones o en el monto del Contrato. Estas órdenes serán emitidas por el SUPERVISOR, mediante carta expresa, o en el Libro de Órdenes, siempre en procura de un eficiente desarrollo y ejecución de la obra. La emisión de Órdenes de Trabajo, no deberán dar lugar a la emisión posterior de Orden de Cambio para el mismo objeto.

b) **Mediante Orden de Cambio:** La orden de cambio se aplicará cuando la modificación a ser introducida implique una modificación del precio del contrato o plazos del mismo, donde se pueden introducir modificación de volúmenes o cantidades de obra (no considerados en la licitación), sin dar lugar al incremento de los precios unitarios, ni crear nuevos ítems. Una orden de cambio no puede modificar las características sustanciales del diseño. El incremento o disminución mediante Orden de Cambio (una o varias sumadas) solo admite el máximo del cinco por ciento (5%) del monto total de Contrato. El documento denominado Orden de Cambio que tendrá número correlativo y fecha del día de emisión, será elaborado con los sustentos técnicos y de financiamiento (disponibilidad de recursos), por el SUPERVISOR y será puesto a conocimiento y consideración del FISCAL, quien con su recomendación enviará al Departamento de Infraestructura, para el procesamiento de su emisión. La Orden de Cambio será firmada por la misma autoridad que firmó el contrato original. Una vez formulada la Orden de Cambio por el SUPERVISOR, el proceso de aprobación y suscripción de la misma debe durar como máximo quince (15) días calendario.

   En el caso de suspensión de los trabajos, el SUPERVISOR elaborará una Orden de Cambio de acuerdo con el procedimiento establecido en la cláusula TRIGÉSIMA SEXTA del presente contrato, en este caso, no se considerará el monto por suspensión como parte del cinco por ciento (5%) establecido en el presente inciso.

c) **Mediante Contrato Modificatorio:** Sólo en caso extraordinario en que la obra deba ser complementada o por otras circunstancias de Fuerza Mayor o Caso Fortuito que determinen una modificación significativa en el diseño de la obra y que signifique un decremento o incremento

independiente a la emisión de Ordenes de Cambio, el SUPERVISOR podrá formular el documento de sustento técnico-financiero que establezca las causas y razones por las cuales debiera ser suscrito este documento.

Esta modalidad de modificación de la obra sólo es admisible hasta el diez por ciento (10%) del monto original del contrato e independiente de la emisión de Orden (es) de Cambio. Los precios unitarios producto de creación de nuevos ítems deberán ser consensuados entre la ENTIDAD y el CONTRATISTA, no se podrán incrementar los porcentajes en lo referido a Costos Indirectos. En el caso que signifique una disminución en la obra, deberá concertarse previamente con el CONTRATISTA, a efectos de evitar reclamos posteriores. El SUPERVISOR, será responsable por la elaboración de las Especificaciones Técnicas de los nuevos ítems creados.

El informe de recomendación y antecedentes deberán ser cursados por el SUPERVISOR al FISCAL, quien luego de su análisis y con su recomendación enviará dicha documentación al departamento de Infraestructura, para el procesamiento de su informe técnico y posterior remisión para la emisión del informe legal y formulación del Contrato, antes de su suscripción, considerando lo establecido en el Artículo 89 de las NB-SABS. Recibida la recomendación e informe la MAE podrá instruir la conformación de una comisión técnica que analizará el informe y emitirá recomendación, considerando aspectos técnicos, financieros y de aprobación del Sistema Nacional de Inversión Pública. Aprobado el mismo, la MAE instruirá el procesamiento de su emisión. El Contrato Modificatorio será firmado por la misma autoridad que firmó el contrato original.

30.5 La Orden de Trabajo, Orden de Cambio o Contrato Modificatorio, deben ser emitidos y suscritos de forma previa a la ejecución de los trabajos por parte del CONTRATISTA, en ninguno de los casos constituye un documento regularizador de procedimiento de ejecución de obra, excepto en casos de emergencia declarada para el lugar de emplazamiento de la obra.

30.6 Una vez formulado el Contrato Modificatorio, el proceso de aprobación y suscripción del mismo debe durar como máximo veinte (20) días calendario.

30.7 En todos los casos son responsables por los resultados de la aplicación de los instrumentos de modificación descritos, el FISCAL DE OBRA, SUPERVISOR y CONTRATISTA.

TRIGÉSIMA PRIMERA.- (PAGO DE TRABAJOS ADICIONALES).
Los trabajos adicionales ordenados conforme a una de las modalidades descritas en la CLÁUSULA TRIGÉSIMA, serán pagados según los precios unitarios de la propuesta aceptada y adjudicada, o de acuerdo con lo expresamente establecido en el Contrato Modificatorio, cuando se traten de ítems de nueva creación.

Mensualmente el CONTRATISTA consignará los volúmenes ejecutados en el certificado o planilla de pago por avance de obra.

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- (MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES).
Queda convenido entre las partes CONTRATANTES, que una vez suscrito el presente contrato, el Cronograma de ejecución de obra propuesto será ajustado en función a la fecha establecida de emisión de la Orden de Proceder, dentro de los quince (15) días calendario subsiguientes a la emisión de la Orden de Proceder y será presentado para su aprobación al SUPERVISOR. En caso que el CONTRATISTA no cumpla con la presentación en el plazo determinado, el SUPERVISOR en un plazo de cinco (5) días calendario actualizará el Cronograma de Ejecución de Obra en base al de la propuesta adjudicada.

Una vez actualizado y aprobado el Cronograma de Ejecución de Obra por el SUPERVISOR y aceptada por la ENTIDAD, constituye un documento fundamental del presente Contrato a los fines del control mensual del AVANCE DE LA OBRA, así como de control del plazo total y cuando corresponda la aplicación de multas.

A los efectos de aplicarse morosidad en la ejecución de la obra, el CONTRATISTA y el SUPERVISOR deberán tener muy en cuenta el plazo estipulado en el Cronograma de Ejecución de la Obra para cada actividad, por cuanto si el plazo previsto para la ejecución de algún hito verificable fenece sin que se haya concluido el mismo en su integridad y en forma satisfactoria, el CONTRATISTA se constituirá en mora sin necesidad de ningún previo requerimiento de la ENTIDAD obligándose a ésta última, aplicar una multa por cada día calendario de retraso

de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$M_i = \frac{2}{3} * \frac{DM_i}{n_i} * MH_i$$

Donde:

$M_i = multa\ aplicada\ por\ incumplimiento\ del\ plazo\ en\ el\ Hito\ i$
$DM_i = \#\ dias\ de\ mora\ correspondiene\ al\ Hito\ i$
$n_i = \#\ de\ dias\ pactado\ para\ la\ ejecucion\ del\ Hito\ i$
$MH_i = Monto\ correspondiente\ al\ Hito\ i$
$i = 1,2,3 \ldots, k\ (k\ Hitos)$

El SUPERVISOR para efectos de control contabilizará la multa acumulada M_a sumando las multas establecidas por cada Hito verificable incumplido, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$M_a = M_1 + M_2 + M_3 + \cdots + M_k$$

De establecer el SUPERVISOR que la multa acumulada por mora M_a es del diez por ciento (10%) o del veinte por ciento (20%) del monto total del Contrato, comunicará oficialmente esta situación a la ENTIDAD a efectos del procesamiento de la resolución del Contrato, si corresponde, conforme a lo estipulado en los incisos i) y j) del sub numeral 21.2.1 de la CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.

En todos los casos de resolución de contrato por causas atribuibles al CONTRATISTA, la ENTIDAD no podrá cobrar multas que excedan el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato.

Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por el SUPERVISOR, bajo su directa responsabilidad, en la Liquidación Final del Contrato, sin perjuicio de que la ENTIDAD ejecute la garantía de Cumplimiento de Contrato y/o proceda al resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la acción coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato, conforme lo establecido en el Art. 47 de la Ley 1178.

Sin perjuicio de las multas señaladas precedentemente, en caso de advertirse incumplimiento a lo establecido en el Formulario A-10, se aplicará una multa (M_{ge}) de acuerdo a lo siguiente:

a) *Cuando el contrato termine por cumplimiento del mismo: Al doble de la diferencia entre el monto total por generación adicional de empleo ($\text{MTGE} = \sum_{i=1}^{i=k} S_i * t_i$) y el monto efectivamente ejecutado (ME) establecido en el informe del SUPERVISOR, previsto en el inciso i) del sub numeral 26.3 de la cláusula VIGÉSIMA SEXTA, de acuerdo a la siguiente formula:*

$$M_{ge} = (MTGE - ME) * 2$$

Donde:

$M_{ge} = Multa\ por\ incumplimiento\ a\ la\ generación\ adicional\ de\ empleo$
$MTGE = Monto\ total\ por\ generación\ adicional\ de\ empleo$
$ME = Monto\ efectivamente\ ejecutado$

b) *Cuando el contrato termine por resolución del mismo: Al doble de la diferencia entre el monto correspondiente a la generación adicional de empleo al momento de la resolución ($\text{MTGE}_p = \sum_{i=1}^{i=p} S_i * t_i$) y el monto efectivamente ejecutado (ME) establecido en el informe del SUPERVISOR, previsto en el inciso i) del sub numeral 26.3 de la cláusula VIGÉSIMA SEXTA, de acuerdo a la siguiente formula:*

$$M_{ge} = (\text{MTGE}_p - ME) * 2$$

Donde:

$M_{ge} = Multa\ por\ incumplimiento\ a\ la\ generación\ adicional\ de\ empleo$
$\text{MTGE}_p = Monto\ comprometido\ por\ generación\ adicional\ de\ empleo\ al\ momento\ de\ la\ resolución$
$ME = Monto\ efectivamente\ ejecutado$

Las multas señaladas en los incisos a) y b) descritos anteriormente no deben ser consideradas como parte de los porcentajes establecidos para la resolución de contrato reguladas en los incisos i) y j) del Sub numeral 21.2.1

de la cláusula VIGÉSIMA PRIMERA del presente contrato. El cobro de la multa se efectivizará a la terminación del contrato (Por cumplimiento de contrato o por resolución del mismo) como parte de la liquidación.

TRIGÉSIMA TERCERA.- (RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA).

33.1 El CONTRATISTA y su representante en la obra están obligados a conocer minuciosamente los planos, instrucciones, especificaciones técnicas y demás documentos de la Obra que le fueron proporcionados.

En caso de existir dudas, hará inmediata y oportunamente una consulta al SUPERVISOR, quién responderá dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud. Esta consulta si es necesaria, se hará antes de proceder a la ejecución de cualquier trabajo.

En caso de no actuar en la forma indicada anteriormente, correrán por cuenta del CONTRATISTA todos los gastos necesarios para subsanar los inconvenientes ocasionados.

33.2 EL CONTRATISTA no podrá entregar obra defectuosa o mal ejecutada aduciendo errores, defectos y misiones en los planos y especificaciones técnicas, debiendo el trabajo erróneo o defectuoso ser subsanado y enmendado por su exclusiva cuenta.

33.3 Cuando el CONTRATISTA incurra en negligencia durante la ejecución de los trabajos o no efectúe la corrección de los mismos dentro del tercer día calendario de recibida la orden correspondiente, el SUPERVISOR podrá proceder a hacer subsanar las deficiencias observadas con cargo y a cuenta del CONTRATISTA, deduciendo su costo del importe de los certificados de avance de obra o la liquidación final, según corresponda.

33.4 Queda también establecido que la ENTIDAD podrá retener el total o parte del importe de las planillas por avance de obra para protegerse contra posibles perjuicios por trabajos defectuosos de la obra y no corregidos oportunamente pese a las instrucciones del SUPERVISOR. Desaparecidas las causales anteriores, la ENTIDAD procederá al pago de las sumas retenidas siempre que, para la solución de ellas no se haya empleado parte o el total de dichos fondos.

Esta retención no creará derechos en favor del CONTRATISTA para solicitar ampliación de plazo, ni intereses.

33.5 Durante el tiempo que demanda la ejecución de la Obra el CONTRATISTA deberá mantener en el sitio de la misma al DIRECTOR de Obra, el personal técnico y la mano de obra necesaria de acuerdo a sus propuestas, con aprobación del SUPERVISOR.

33.6 El DIRECTOR de Obra deberá ser necesariamente el profesional, calificado en la propuesta, con experiencia en ejecución de obras similares a las previstas en el presente Contrato y representará al CONTRATISTA en el sitio de la ejecución de la obra.

Sin embargo, esta previsión de ningún modo relevará al CONTRATISTA de sus responsabilidades contractuales específicas y generales bajo el presente CONTRATO.

33.7 **Personal.**- El CONTRATISTA deberá emplear el personal técnico clave mencionado en su propuesta, para llevar a cabo las funciones especificadas. El FISCAL DE OBRA aprobará el reemplazo del personal *clave sólo cuando la calificación, capacidad y experiencia de ellos sean iguales o superiores a las del* personal propuesto en la oferta del CONTRATISTA. Si el SUPERVISOR solicita la remoción de un miembro del personal o integrante de la fuerza laboral del CONTRATISTA, indicando las causas que motivan el pedido, el CONTRATISTA se ocupará de que dicha persona se retire de la Zona de Obras dentro de siete (7) días calendario y no tenga ninguna otra participación en los trabajos relacionados con el contrato.

33.8 **Otros CONTRATISTAS.**- El CONTRATISTA deberá cooperar y compartir la zona de obras con otros CONTRATISTAS, autoridades públicas, empresas de servicios y con la ENTIDAD en los periodos especificados en la lista de otros CONTRATISTAS. La ENTIDAD podrá modificar la lista de Otros CONTRATISTAS, y notificará al CONTRATISTA.

33.9 EL CONTRATISTA deberá instalar uno o dos letreros en la obra (según corresponda). En el letrero se registrará que la obra es realizada por la ENTIDAD *(Universidad autónoma Tomás Frías, con recursos de IDH y Otros Recursos)*, tendrá las dimensiones y características de acuerdo al modelo proporcionado por la ENTIDAD a través del SUPERVISOR.

33.10 El CONTRATISTA custodiará todos los materiales, equipo y todo trabajo ejecutado, hasta la Recepción Definitiva de la obra, por la ENTIDAD.

33.11 El CONTRATISTA mantendrá permanentemente barreras, letreros, luces y señalización adecuada y en general todo medio de seguridad en el lugar de la Obra, que prevenga a terceros del riesgo de accidentes. Dichos elementos serán retirados por el CONTRATISTA, a la terminación de la Obra.

33.12 El CONTRATISTA protegerá de posibles daños a las propiedades adyacentes a la Obra. En caso de que *éstos se produzcan deberán ser resarcidos bajo su exclusiva responsabilidad, debiendo indemnizar* por daños causados por las obras del CONTRATISTA a los propietarios vecinos de la Obra y de toda lesión causada a terceras personas como resultado de sus trabajos.

33.13 El CONTRATISTA precautelará de daños a cañerías, árboles, conductores, torres y cables de instalación eléctrica, debiendo reparar cualquier daño o desperfecto ocasionado por su propia cuenta y riesgo. Para efecto la entidad proporcionará los planos e información necesaria.

33.14 El CONTRATISTA mantendrá el área de trabajo libre de obstáculos y desperdicios; a la terminación de la obra removerá todos los obstáculos y materiales dejando la obra en estado de limpieza y esmero, a satisfacción del SUPERVISOR y de la ENTIDAD.

33.15 El CONTRATISTA está obligado a dar cumplimiento a las obligaciones emergentes del pago de las cargas sociales y tributarias contempladas en su propuesta, en el marco de las leyes vigentes, y presentar a requerimiento de la entidad, el respaldo correspondiente.

33.16 Cumplir el formulario A-10, asumiendo que su incumplimiento es causal de aplicación de multas por generación de empleo establecido en la Cláusula Trigésima Segunda.

TRIGÉSIMA CUARTA.- (SEGUROS).
Serán riesgos del CONTRATISTA los riesgos por lesiones personales, muerte y pérdida o daño a la propiedad (incluyendo sin limitación alguna, las obras, Planta, materiales y Equipo) desde la fecha de inicio hasta la emisión del certificado de corrección de defectos

El CONTRATISTA deberá contratar seguros a nombre conjunto del CONTRATISTA y/o de la ENTIDAD para cubrir eventualidades durante el periodo comprendido entre la fecha de iniciación y el vencimiento del periodo de responsabilidad por defectos, por los montos totales y sumas deducibles, para los siguientes eventos que son de riesgo del CONTRATISTA:

34.1 **Seguro de la obra:** Durante la ejecución de la obra, el CONTRATISTA deberá mantener por su cuenta y cargo una Póliza de Seguro adecuada, para asegurar contra todo riesgo, las obras en ejecución, materiales, instalaciones del SUPERVISOR, equipos que estime convenientes, vehículos, etc.

34.2 **Seguro contra accidentes personales:** Los empleados y trabajadores del CONTRATISTA, que trabajan en la Obra, deberán estar asegurados contra accidentes personales, incluyendo los riesgos de muerte, invalidez parcial y total o permanente, por montos que sean por lo menos equivalentes al mínimo de las compensaciones exigidas en la legislación vigente por accidentes de trabajo.

34.3 **Seguro de responsabilidad civil:** El CONTRATISTA, antes de iniciar la ejecución de la Obra, deberá sin que esto limite sus obligaciones y responsabilidad obtener a su propio costo, coberturas de seguro sobre daños a terceros.

Dicho seguro deberá ser obtenido bajo los términos establecidos en este Contrato para ser aprobados por el SUPERVISOR, por un valor no inferior al uno por ciento (1%) del monto total del Contrato.

El CONTRATISTA deberá entregar al SUPERVISOR o al FISCAL DE OBRA, para su aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la fecha de iniciación especificada. Dichos seguros deberán proporcionar compensación pagadera en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o perjuicio ocasionado.

Si el CONTRATISTA no proporciona las pólizas y los certificados exigidos, la ENTIDAD podrá contratar los seguros referidos y recuperar las primas pagadas de los pagos que se adeuden al CONTRATISTA, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del CONTRATISTA.

a) Las pólizas de seguro no podrán modificarse sin la aprobación del SUPERVISOR o el FISCAL DE OBRA.
b) Ambas partes deberán cumplir con las condiciones de las pólizas de seguro.

El CONTRATISTA deberá cumplir con la Ley N° 1155, de 12 de marzo de 2019, del Seguro Obligatorio de Accidentes de la Trabajadora y el Trabajador en el Ámbito de la Construcción – SOATC y su reglamentación.

TRIGÉSIMA QUINTA.- (INSPECCIONES).
El CONTRATISTA deberá permitir al SUPERVISOR, al FISCAL DE OBRA y al personal técnico de la ENTIDAD o financiador, y a cualquier persona autorizada por éste, el acceso a la zona de obras y a todo lugar donde se estén realizando o se prevea realizar trabajos relacionados con el Contrato.

La ENTIDAD entregará al CONTRATISTA la posesión de la totalidad de la zona de obras. Si no se entregara la posesión de alguna parte en la fecha del desembolso del anticipo, se considerará que la ENTIDAD ha demorado el inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye un evento compensable.

TRIGÉSIMA SEXTA.- (SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS).
La ENTIDAD está facultada para suspender temporalmente los trabajos en la obra en cualquier momento, por motivos de fuerza mayor, caso fortuito y/o convenientes a los intereses del Estado, para lo cual notificará al CONTRATISTA por escrito, por intermedio del SUPERVISOR, con una anticipación de cinco (5) días calendario, excepto en los casos de urgencia por alguna emergencia imponderable. Esta suspensión puede ser parcial o total.

En este caso la ENTIDAD reconocerá en favor del CONTRATISTA los gastos en que éste incurriera por conservación y mantenimiento de la obra, cuando el lapso de la suspensión sea mayor a los veinte (20) días calendario. A efectos del pago de estos gastos el SUPERVISOR llevará el control respectivo de personal y equipo paralizado, del que realice labores administrativas y elaborará la respectiva Orden de Cambio conteniendo el importe y plazo que en su caso corresponda, para que se sustente el pago y la ampliación del plazo.

Asimismo, el SUPERVISOR podrá ordenar la suspensión temporal de la obra por condiciones meteorológicas excepcionalmente desfavorables, por la inseguridad total de las obras o de una parte de las mismas o si se presentan situaciones de Fuerza Mayor. Esta suspensión puede ser parcial o total. En este caso, cuando el trabajo fuera totalmente suspendido por más de quince (15) días calendario y la(s) actividad(es) suspendida(s) se encontrará en la ruta crítica del cronograma vigente, el número de días en que los trabajos se encuentren suspendidos se añadirá al plazo del CONTRATO, a cuyo efecto el SUPERVISOR preparará la respectiva Orden de Cambio.

Para efectos de la elaboración de la Orden de Cambio, se computarán los costos a partir de transcurridos los quince (15) días calendario establecidos para el efecto.

También el CONTRATISTA puede comunicar al SUPERVISOR o a la ENTIDAD, la suspensión o paralización temporal de los trabajos en la obra, por causas atribuibles a la ENTIDAD que afecten al CONTRATISTA en la ejecución de la obra.

Si los trabajos se suspenden parcial o totalmente por negligencia del CONTRATISTA en observar y cumplir correctamente condiciones de seguridad para el personal o para terceros o por incumplimiento de las órdenes impartidas por el SUPERVISOR o por inobservancia de las prescripciones del Contrato, el tiempo que los trabajos permanezcan suspendidos, no merecerá ninguna ampliación de plazo para la entrega de la Obra, ni corresponderá pago alguno por el mantenimiento de la misma.

TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- (COMISIÓN DE RECEPCIÓN).
Una Comisión de Recepción, tendrá actuación obligatoria en todos los procesos de recepción de obras, designada en razón de la naturaleza de la contratación y la especialidad técnica requerida por los miembros que la constituyan.

La Comisión de Recepción designada por la MAE (o la autoridad delegada para el efecto), estará conformada por personal de línea de la entidad y según su propósito estará integrada por:

a) El fiscal asignado a la obra.
b) Un representante del Unidad Administrativa
c) Un representante técnico de la Unidad Solicitante.
d) Uno o más servidores públicos que la MAE considere necesarios.

La Comisión de Recepción tiene la responsabilidad de efectuar la recepción, provisional y/o definitiva de las obras contratadas, en concordancia con lo establecido en el Documento Base de Contratación, debiendo dar su conformidad luego de verificar también el cumplimiento de las especificaciones, términos y condiciones del contrato.

TRIGÉSIMA OCTAVA.- (RECEPCIÓN DE OBRA).
A la conclusión de la obra, el CONTRATISTA solicitará a la SUPERVISIÓN una inspección conjunta para verificar que todos los trabajos fueron ejecutados y terminados en concordancia con las cláusulas del contrato, planos y especificaciones técnicas y que, en consecuencia, la obra se encuentra en condiciones adecuadas para su entrega.

El CONTRATISTA en el plazo de cinco (5) días hábiles antes de que fenezca el plazo de ejecución de la obra, o antes, mediante el Libro de órdenes solicitará al SUPERVISOR señale día y hora para la realización del Acto de Recepción Provisional de la Obra.

Si la obra, a juicio técnico del SUPERVISOR se halla correctamente ejecutada, conforme a los planos documentos del CONTRATO, mediante el FISCAL DE OBRA hará conocer a la ENTIDAD su intención de proceder a la recepción provisional; este proceso no deberá exceder el plazo de tres (3) días hábiles.

La Recepción de la Obra será realizada en dos etapas que se detallan a continuación:

38.1 Recepción Provisional. Esta etapa contempla:

La Limpieza final de la Obra. Para la entrega provisional de la obra, el CONTRATISTA deberá limpiar y eliminar todos los materiales sobrantes, escombros, basuras y obras temporales de cualquier naturaleza, excepto aquellas que necesite utilizar durante el periodo de garantía. Esta limpieza estará sujeta a la aprobación de la SUPERVISIÓN. Este trabajo será considerado como indispensable para la recepción provisional y el cumplimiento del contrato. Si esta actividad no fue incluida de manera independiente en el presupuesto, no será sujeto de pago directo, debiendo el CONTRATISTA incluir su incidencia en el componente de Gastos Generales.

La Recepción Provisional se iniciará cuando el SUPERVISOR reciba la carta de aceptación de la ENTIDAD, en este caso tiene un plazo máximo de tres (3) días hábiles, para proceder a dicha Recepción Provisional, de lo cual se dejará constancia escrita en Acta circunstanciada que se levantará al efecto por la Comisión de Recepción, en la que se harán constar todas las deficiencias, anomalías e imperfecciones que pudieran ser verificadas en esta diligencia, instruyéndose sean subsanadas por el CONTRATISTA dentro del periodo de corrección de defectos, computables a partir de la fecha de dicha Recepción Provisional.

El SUPERVISOR deberá establecer de forma racional en función al tipo de obra el plazo máximo para la realización de la Recepción Definitiva, mismo que no podrá exceder de ciento ochenta (180) días calendario. La fecha de esta recepción servirá para efectos del cómputo final del plazo de ejecución de la obra. Si a juicio del SUPERVISOR, las deficiencias y observaciones anotadas no son de magnitud y el tipo de obra lo permite, podrá autorizar que dicha obra sea utilizada. Empero las anomalías fueran mayores, el SUPERVISOR tendrá la facultad de rechazar la recepción provisional y consiguientemente, correrán las multas y sanciones al CONTRATISTA hasta que la obra sea entregada en forma satisfactoria.

Liquidación de saldos (PLANILLA DE LIQUIDACIÓN FINAL) Dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha de Recepción Provisional, el SUPERVISOR elaborará una planilla de cantidades finales de obra, con base a la Obra efectiva y realmente ejecutada, dicha planilla será cursada al CONTRATISTA para que el mismo dentro del plazo de diez (10) días calendario subsiguientes elabore la planilla o Certificado de Liquidación Final conjuntamente con los planos "AS BUILT" y la presente al SUPERVISOR en versión definitiva con fecha y firma del DIRECTOR de Obra

Asimismo, el CONTRATISTA podrá establecer el importe de los pagos a los cuales considere tener derecho, que hubiesen sido reclamados sustentada y oportunamente (dentro de los treinta (30) días de sucedido el hecho que originó el reclamo) y que no hubiese sido pagado por la ENTIDAD.

Si el CONTRATISTA no elaborara la planilla o Certificado de Liquidación Final en el plazo establecido, el SUPERVISOR en el plazo de cinco (5) días calendario procederá a la elaboración de la planilla o Certificado de Liquidación Final, que será aprobada por el FISCAL DE OBRA, dicha planilla no podrá ser motivo de reclamo por parte del CONTRATISTA.

Con la planilla o Certificado de Liquidación Final se procederá a la Liquidación de Saldos para establecer si el CONTRATISTA tiene saldos a favor o en contra a efectos de proceder si corresponde a la devolución de Garantías.

Si efectuada la Liquidación de Saldos se estableciera saldos en contra del CONTRATISTA, la ENTIDAD procederá al cobro del monto establecido, mismo que deberá ser depositado por el CONTRATISTA en las cuentas fiscales de la ENTIDAD en el plazo de diez (10) días calendario computables a partir del día siguiente de efectuada la Liquidación de Saldos, de incumplir el CONTRATISTA con el deposito señalado, la ENTIDAD podrá recurrir a la ejecución de garantías; asimismo, podrá recurrir a la vía coactiva fiscal, por la naturaleza administrativa del Contrato.

38.2 Recepción Definitiva. Se realiza de acuerdo al siguiente procedimiento:

Cinco (5) días hábiles antes de que concluya el plazo previsto para la recepción definitiva, posterior a la entrega provisional, el CONTRATISTA mediante carta expresa o en el Libro de Órdenes, solicitará al SUPERVISOR el señalamiento de día y hora para la Recepción Definitiva de la obra, haciendo conocer que han sido corregidas las fallas y subsanadas las deficiencias y observaciones señaladas en el Acta de Recepción Provisional (si estas existieron).

El SUPERVISOR señalará la fecha y hora para el acto de Recepción Definitiva y pondrá en conocimiento de la ENTIDAD, en un plazo máximo de tres (3) días hábiles computables desde la solicitud del CONTRATISTA. Vencido dicho plazo el CONTRATISTA podrá dirigir su solicitud directamente al FISCAL a efectos de que la Comisión de Recepción realice la Recepción Definitiva de la obra.

La Comisión de Recepción realizará un recorrido e inspección técnica total de la OBRA y si no surgen observaciones, procederá a la redacción y suscripción del Acta de Recepción Definitiva. Ningún otro documento que no sea el Acta de Recepción Definitiva de la Obra podrá considerarse como una admisión de que el contrato, o alguna parte del mismo, ha sido debidamente ejecutado, por tanto, no se podrá considerar que el contrato ha sido completamente ejecutado, mientras no sea suscrita el Acta de Recepción Definitiva de la OBRA, en la que conste que la OBRA ha sido concluida a entera satisfacción de la ENTIDAD, y entregada a esta institución.

Si en la inspección se establece que no se subsanaron o corrigieron las deficiencias observadas, no se procederá a la Recepción Definitiva hasta que la OBRA esté concluida a satisfacción y en el lapso que medie desde el día en que debió hacerse efectiva la entrega hasta la fecha en que se realice efectivamente, correrá la multa pertinente, aplicándose lo previsto en la Cláusula TRIGÉSIMA SEGUNDA del presente Contrato. Dicha multa deberá considerar el monto de las deficiencias y el plazo demorado desde la fecha prevista para la recepción definitiva hasta la fecha que se efectivice la entrega, que deberá ser cobrada de la última planilla de pago adeudada.

En el caso que la Comisión de Recepción no realizará el acto de Recepción de la Obra en los treinta (30) días calendario, posteriores a la notificación del CONTRATISTA, se aplicará el silencio administrativo

38.3 **Devolución de la garantía:** *Una vez que se haya emitido el Acta de Recepción Definitiva, la ENTIDAD en el plazo de diez (10) días calendario, procederá a la devolución de la(s) garantía(s) si es que el resultado de la Liquidación de Saldos fue a favor del CONTRATISTA*

TRIGÉSIMA NOVENA.- (CIERRE DE CONTRATO).
El cierre de Contrato deberá ser acreditado con un **CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO**, otorgado por la ENTIDAD, luego de la recepción definitiva y de concluido el trámite precedentemente especificado.

CUADRAGÉSIMA.- (PROCEDIMIENTO DE PAGO DE LA PLANILLA O CERTIFICADO DE LIQUIDACIÓN FINAL).
Se debe tener presente que deberá descontarse del importe del Certificado Final los siguientes conceptos:

a) Sumas anteriores ya pagadas en los certificados o planillas de avance de obra.
b) Reposición de daños, si hubieren.
c) El porcentaje correspondiente a la recuperación del anticipo si hubiera saldos pendientes.
d) Las multas y penalidades, si hubieren.

Preparado así el certificado final y debidamente aprobado por el SUPERVISOR en el plazo máximo de treinta (30) días calendario, éste lo remitirá al FISCAL DE OBRA, para su aprobación y conocimiento, quien en su caso requerirá las aclaraciones que considere pertinentes; caso contrario lo remitirá a la dependencia establecida por la ENTIDAD, para el procesamiento del pago correspondiente.

CUADRAGÉSIMA PRIMERA.- (CONFORMIDAD). En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento firman el presente CONTRATO en cuatro ejemplares de un mismo tenor y validez el Ph.D. Ing. Pedro Guido López Cortés, en representación legal de la ENTIDAD, y la Sra. Patricia Noemí Chumacero Viscarra, en representación legal del CONTRATISTA.

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado ante la Contraloría General del Estado.

Usted Señor Notario se servirá insertar todas las demás cláusulas que fuesen de estilo y seguridad.

Potosí, 24 de abril de 2025

Ph.D. Ing. Pedro Guido López Cortés
RECTOR UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "TOMÁS FRÍAS"

Sra. Patricia Noemí Chumacero Viscarra
EMPRESA CONSTRUCTORA KODESH

CONSTRUCTORA KODESH
POTOSÍ - BOLIVIA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA TOMAS FRÍAS



"CONSTRUCCIÓN EDIFICIO POSTGRADO"

CONSTRUCTORA KODESH

FOTOCOPIA DE LIBRO DE ORDENES

Dirección: Calle Lucas Jaimes No. 72 Interior Teléfono: 70473724
E-Mail: constrctora_kodesh@hotmail.com

¿Nuestro Futuro depende de lo que hagamos hoy!

LIBRO DE ORDENES

CONTRATANTE: .....
OBRA: .....
DIRECCIÓN: ..... FECHA: .....
ZONA: .....

Aleg. Rose Mary A. NOTARIA DE FE PUBLICA Nº 13 POTOSI - BOLIVIA Nº 000019 26.05.2023

Potosi 10 de Septiembre del 2025

De: Director de O.
A: Supervisión

Se hace notar a supervisión que el día de ayer Martes 9 existió la presencia de precipitaciones pluviales, por lo cual solicitamos tomar en cuenta para posibles ampliaciones de plazo, también se tiene preparado 5 columnas de arranque, y 7 ejes de vigas de arriostre, por lo cual solicitamos la verificación y posterior autorización para proceder con el vaciado de las mismas

Ronald G. Rustillos Quiroga
INGENIERO CIVIL
R.N.I 20311

Potosi 10 de Septiembre de 2025

De - Supervisor
A - Director de obras

Habiendo revisado los elementos correspondientes, se aprueban las mismas y se autoriza su vaciado tomando en cuenta especificaciones.
Igualmente se instruye a la empresa realizar el procedimiento correspondiente para el caso de ampliación por lluvias.

Ing. Dorely Taboada Quintana
SUPERVISOR DE OBRAS
U. A. T. F.

Director de Obra

Supervisor

LIBRO DE ORDENES

CONTRATANTE:.....
OBRA:.....
DIRECCIÓN:.....
ZONA:.....
FECHA:.....

Rose Mary Ayala Nota Pública Nº 13 Potosí - Bolivia
Nº 000020
26.05.2023
APROPIO

POTOSI 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

DE: DIRECTOR DE O.
A: SUPERVISIÓN

SE HACE NOTAR A SUPERVISIÓN QUE EL DÍA DE AYER EXISTIÓ LA PRESENCIA DE PRESIPITACIONES PLUVIALES, POR LO CUAL SOLICITAMOS TOMAR EN CUENTA PARA POSIBLES AMPLIACIONES DE PLAZO

Ronald G. Bustillos Quiroga
INGENIERO CIVIL
R.N.I.

Potosí 15 de septiembre de 2025
De Supervisión
A:- Dirección de obras

Se realiza el registro correspondiente, igualmente se instruye a la empresa que se realice el procedimiento adecuado para el caso de ampliaciones por lluvias mediante una Orden de cambio por ampliación de plazo

Ing. Dorisly Taborda Quintana
SUPERVISOR DE OBRAS
U. A. T. F.

Director de Obra

Supervisor

LIBRO DE ORDENES

CONTRATANTE: .....
OBRA: .....
DIRECCIÓN: ..... FECHA: .....
ZONA: .....

Dra. ROSE MARY ... NOTARIA DE FE PÚB. Nº 000021 ... POTOSI - BOLIVIA

POTOSI 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

DE: DIRECTOR DE O.
A: SUPERVISIÓO

SE HACE NOTAR A SUPERVISIOU QUE EL DÍA DE AYER MIERCOLES 17 EXISTIO LA PRESENCIA DE PRECIPITACIONES PLUVIALES POR LO CUAL SOLICITAMOS TOMAR EN CUENTA PARA POSIBLES AMPLIACIONES DE PLAZO, TAMBIEN SE TIENE PREPARADO 19 COLUMNAS POR LO CUAL SOLICITAMOS LA VERIFICACIÓN Y POSTERIOR AUTORIZACIÓN PARA PROCEDER CON EL VACIADO DE LAS MISMAS.

Ronald G. Bustillos Quiroga
INGENIERO CIVIL
R.N.I 20.511

Potosí 18 de septiembre del 2025

De: Supervisión

A: Dirección de obras

Se registra para posibles ampliaciones posteriores que en caso de realizarse deberán cumplir el procedimiento correspondiente

Igualmente, habiendo verificado los elementos solicitados, se aprueban y se autoriza el vaciado de los mismos

Ing. Damisly Taboada Quiniana
SUPERVISOR DE OBRAS
U. A. T. F.

Director de Obra

Supervisor

LIBRO DE ORDENES

CONTRATANTE: .....
OBRA: .....
DIRECCIÓN: ..... FECHA: .....
ZONA: .....

Lic. Rose Mary Arias Bara
NOTARIA DE FE PUBLICA
Nº 000022
26/05/2023
DIRNOR-U
POTOSI - BOLIVIA

POTOSI 2 DE OCTUBRE DEL 2025

DE: DIRECTOR DE O.
A: SUPERVISIÓN

A LA FECHA SE TIENE PREPARADO 6 COLUMNAS POR LO CUAL SOLICITAMOS LA VERIFICACIÓN Y POSTERIOR AUTORIZACIÓN PARA PROCEDER CON EL VACIADO DE LAS MISMAS.

Ronald G. Bustillos Quiroga
INGENIERO CIVIL
R.N.I 20311

Potosi 02 de octubre del 2025

De - Supervisión

A - Dirección de obras

Habiendo verificado los elementos solicitados, se autoriza a la empresa el vaciado de los mismos cumpliendo con las especificaciones técnicas y procedimientos correspondientes.

Ing. Daniely Taboada Quintana
SUPERVISOR DE OBRAS

Director de Obra

Supervisor

LIBRO DE ORDENES

CONTRATANTE: .....
OBRA: .....
DIRECCIÓN: ..... FECHA: .....
ZONA: .....

Abg. Rose Mary Arias Vera
NOTARIA DE FÉ PÚBLICA
Nº 013/2023
26.05.2023
DIRNOPLU
POTOSI - BOLIVIA

POTOSI 12 DE OCTUBRE DEL 2025

DE: DIRECTOR DE O.
A: SUPERVISIÓN

A LA FECHA SE TIENE PREPARADO 12 COLUMNAS POR LO CUAL SOLICITAMOS LA VERIFICACIÓN Y POSTERIOR AUTORIZACIÓN PARA PROCEDER CON EL VACIADO DE LAS MISMAS.

Ronald G. Bustillos Quiroga
INGENIERO CIVIL
R.N.I 20.011

Potosí 12 de octubre de 2025

De- Supervisión
A- Dirección de obras

Se informa a la empresa que se realizó la revisión de los elementos solicitados, mismos que fueron aprobados para el vaciado de Hormigones siguiendo las especificaciones correspondientes.

Ing. Daniely Taboada Quintana
SUPERVISOR DE OBRAS

Director de Obra

Supervisor

LIBRO DE ORDENES

CONTRATANTE: .....
OBRA: .....
DIRECCIÓN: ..... FECHA: .....
ZONA: .....

Aág. Rose Mary Arteaga Vera
NOTARIA DE FE PUBLICA
N° 000124
No 13
26.05.2023
POTOSI - BOLIVIA

POTOSI 17 DE OCTUBRE DEL 2025

DE: DIRECTOR DE O.
A: SUPERVISOR

SE HACE NOTAR A SUPERVISIÓN QUE EL DIA MIERCOLES 15 EXISTIO LA PRESENCIA DE PRECIPITACIONES PLUVIALES, POR LO CUAL SOLICITAMOS TOMAR EN CUENTA PARA POSIBLES AMPLIACIONES DE PLAZO, A LA FECHA SE TIENE PREPARADO 17 COLUMNAS, POR LO CUAL SOLICITAMOS LA VERIFICACION Y POSTERIOR AUTORIZACION PARA PROCEDER CON EL VACIADO DE LAS MISMAS

Ronald G. Bustillos Quiroga
INGENIERO CIVIL
R.N. 120311

Potosí 17 de octubre de 2025

De: Supervisión
A: Dirección de obras

Se informa a la empresa que los elementos solicitados fueron verificados y aprobados para su vaciado, igualmente, se realiza el registro de las lluvias mencionadas; pero se instruye a la empresa realizar el procedimiento adecuado para el caso de ampliaciones por lluvias.

Director de Obra

Ing. Daniel Teisoda Quintana
SUPERVISOR DE OBRAS
U. A. T. F.

LIBRO DE ORDENES

CONTRATANTE: .....
OBRA: .....
DIRECCIÓN: .....
ZONA: .....
FECHA: .....

Abg. Rose Mary Arias Vera
NOTARÍA DE FÉ PÚBLICA
Nº 600025
26.05.2023
POTOSI - BOLIVIA

POTOSI 23 DE OCTUBRE DEL 2023

DE: DIRECTOR DE O.
A: SUPERVISION

A LA FECHA SE TIENE PREPARADO 12 COLUMNAS, POR LO CUAL SOLICITAMOS LA VERIFICACIÓN Y POSTERIOR AUTORIZACIÓN PARA PROCEDER CON EL VACIADO DE LAS MISMAS.

Ronald G. Bustillos Quiroga
INGENIERO CIVIL
C.I.P. R.N. 122...

Potosí 23 de octubre de 2023

De- Supervisión
A.: Dirección de obras.

Habiendo verificado las columnas correspondientes, se autoriza a la empresa el vaciado de las mismas prestando bastante cuidado a la dosificación.

Ing. Daniely Taboada Quintana
SUPERVISOR DE OBRAS
U. A. T. F.

Director de Obra

Supervisor

LIBRO DE ORDENES

CONTRATANTE:.....
OBRA:.....
DIRECCIÓN:.....
ZONA:.....
FECHA:.....

Rose Mary Arias Vera
NOTARIA
Nº 000026
Nº 13
26.05.2023
DERECHOS REALES
POTOSI - BOLIVIA

POTOSI 31 DE OCTUBRE DEL 2025

DE: DIRECTOR DE O.
A: SUPERVISIÓN

A LA FECHA SE TIENE PREPARADO 14 COLUMNAS, POR LO CUAL SOLICITAMOS LA VERIFICACIÓN Y POSTERIOR AUTORIZACIÓN PARA PROCEDER CON EL VACIADO DE LAS MISMAS

Ronald G. Bustillos Quiroga
INGENIERO CIVIL
R. N. 1 2037

Potosi 31 de octubre de 2025

De - Supervisión
A - Dirección de obras

Habiendo verificado la armadura y encofrado, se autoriza el vaciado de dichos elementos y se instruye prestar bastante cuidado en el contenido de agua y la toma de muestras de Ho. para ser posteriormente roturo

Director de Obra

Supervisor
Ing. Daniely Taboada Quintana
SUPERVISOR DE OBRAS
U. A. T. T.

LIBRO DE ORDENES

CONTRATANTE:.....
OBRA:.....
DIRECCIÓN:..... FECHA:.....
ZONA:.....

NOTARÍA DE FÉ PÚBLICA Nº 000027 26.05.2023 POTOSI - BOLIVIA

POTOSI 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025

DE: DIRECTOR DE O.
A: SUPERVISIÓN

SE HACE NOTAR A SUPERVISIÓN QUE EL DIA MIERCOLES 12 Y JUEVES 13 EXISTIÓ LA PRESENCIA DE PRECIPITACIONES PLUVIALES POR LO CUAL SOLICITAMOS TOMAR EN CUENTA PARA POSIBLES AMPLIACIONES DE PLAZO, A LA FECHA SE VIENE ARMANDO LAS VIGAS Y LOSA DEL PRIMER NIVEL.

Rolando G. Bustillos Quiroga
S.I.B.C. INGENIERO CIVIL
R.N.I 20.311

Potosi 14 de noviembre de 2025

De: Supervisión
A: Dirección de obras.

Se registra la solicitud emitida; pero se recuerda a la empresa que deberá realizar el procedimiento adecuado para la ampliación de plazo con Orden de Cambio.

Ing. Daniely Taboada Quintana
SUPERVISOR DE OBRAS
U. A. T. F.

Director de Obra

Supervisor

LIBRO DE ORDENES

CONTRATANTE: .....
OBRA: .....
DIRECCIÓN: .....
ZONA: .....
FECHA: .....

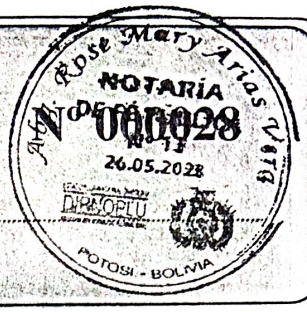

POTOSI 17 DE NOVIEMBRE DEL 2025

DE: DIRECTOR DE O.
A: SUPERVISIÓN

SE HACE CONOCER A SUPERVISIÓN, QUE, DEBIDO A LA ESCASEZ DE COMBUSTIBLE ESTAMOS DEMORANDO TIEMPOS MUY LARGOS EN LLEGAR LOS MATERIALES A CONSECUENCIA DEL TRANSPORTE POR LO CUAL SOLICITAMOS TOMAR EN CUENTA PARA POSIBLES AMPLIACIONES DE PLAZO.

Ronald G. Bustillos Quiroga
INGENIERO CIVIL
R.N.I. 25311

Potosí 17 de noviembre de 2025

De- Supervisión

A- Dirección de obras.

Se realiza el registro del acuito, pero se instruye a la empresa documentar el hecho para los justificativos de la Orden de cambio correspondiente.

Ing. Daniely Taboada Quintana
SUPERVISOR DE OBRAS

.....
Director de Obra

.....
Supervisor

LIBRO DE ORDENES

CONTRATANTE:
OBRA:
DIRECCIÓN:
ZONA:
FECHA:

Nº 000029

Abg. Rose Mary Arias Vera
DIRECTORA JURÍDICA DE LA DEPENDENCIA
Nro 93
26.05.2023
DEMOPLU
POTOSI - BOLIVIA

POTOSI 21 DE NOVIEMBRE DEL 2025

DE: DIRECTOR DE O.
A: SUPERVISIÓN

A LA FECHA SE CONTINUA CON EL ARMADO DE VIGAS Y LOSA, HACIENDO NOTAR QUE EL DÍA DE HOY EXISTIÓ LA PRESENCIA DE PRECIPITACIONES PLUVIALES, POR LO CUAL SOLICITAMOS TOMAR EN CUENTA PARA POSIBLES AMPLIACIONES DE PLAZO.

Ronald G. Bustillos Quiroga
INGENIERO CIVIL
R. N. I 20.311

Potosí 21 de Noviembre de 2025

De Supervisión
A. Dirección de obras

Se registra el presente y se instruye a la empresa documentar los hechos mediante reportes del SENAMHI

Ing. Daniely Taboada Quintana
SUPERVISOR DE OBRAS
U. A. T. F.

Director de Obra

Supervisor

LIBRO DE ORDENES

CONTRATANTE:
OBRA:
DIRECCIÓN:
ZONA:
FECHA:

Nº 000030
Ana José Mary Arias Vera
DE FÉ PÚBLICA
Nº 13
26.05.2023
DIRNOPLU
POTOSÍ - BOLIVIA

POTOSÍ 28 DE NOVIEMBRE DEL 2025

DE: DIRECTOR DE O.
A: SUPERVISIÓN

UNA VEZ CONCLUIDO EL ARMADO, DE LA LOSA SE SOLICITA LA VERIFICACIÓN DE LA MISMA, Y POSTERIOR AUTORIZACIÓN PARA PROCEDER CON LA EJECUCIÓN DEL HORMIGONADO.

Ronald G. Bustillos Quiroga
INGENIERO SIVIL
R.N.I. 21311

Potosí 28 de noviembre de 2025

De Supervisión
A Dirección de obras.

Se informa a la empresa que se realizó la verificación de la losa, instalaciones, agregados, etc. por lo que se autoriza el vaciado de la misma desde dos frentes; se recomienda cumplir a cabalidad las especificaciones, dosificaciones, y posterior curado de las estructuras

Ing. Daniely Taboada Quintana
SUPERVISOR DE OBRAS
U. A. T. F.

Director de Obra

Supervisor

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA TOMAS FRÍAS



"CONSTRUCCIÓN EDIFICIO POSTGRADO"

CONSTRUCTORA KODESH

FOTOCOPIA DE ORDEN DE PROCEDER

Dirección: Calle Lucas Jaimes No. 72 Interior Teléfono: 70473724
E-Mail: constrctora_kodesh@hotmail.com

¡Nuestro Futuro depende de lo que hagamos hoy!

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "TOMÁS FRÍAS"

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

ACTA DE INICIO DE OBRA

A horas 08:30 del día 6 de mayo de 2025 en el predio ubicado en Av. Las Banderas s/n, propiamente en la Ciudadela Universitaria de la ciudad de Potosí, del departamento de Potosí se reunieron los señores:

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA: Ing. Roger Barahona Telchi.
FISCAL DE OBRAS: Ing. Juan Chara Chuquisea.
SUPERVISOR DE OBRA: M. Sc. Ing. Daniely Taboada Quintana.
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA: Lic. Patricia Noemi Chumacero Viscarra.

Para dar inicio y orden de proceder a la ejecución de:

NOMBRE DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN EDIFICIO POSGRADO"
TIPO DE PROYECTO: Construcción.
MONTO ADJUDICADO: Bs.- 3'367.031,95 (Son: Tres millones, trescientos sesenta y siete mil treinta y uno con 95/100 bolivianos).
PLAZO DE EJECUCIÓN: 270 (Doscientos setenta) días calendario.
FECHA DE CONCLUSIÓN: viernes, 30 de enero de 2026
EMPRESA CONSTRUCTORA: Empresa Unipersonal Constructora "KODESH"

Firmas:

Ronald G. Bustillos Quiroga
INGENIERO CIVIL
R. N. I 20.311

REPRESENTANTE
EMPRESA CONSTRUCTORA

SUPERVISOR DE OBRA

Ing. Juan Chara Chuquisea
FISCAL DE OBRAS – U.A.T.F

FISCAL DE OBRA

JEFE DE INFRAESTRUCTURA

c.c./Arch. /UATF/Fiscal/Supervisor/Emp. Constructora.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "TOMÁS FRÍAS"

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

Potosí, 6 de mayo de 2025

ORDEN DE PROCEDER

En la presente fecha martes, 6 de mayo de 2025 a horas 08:30 am, se da la ***Orden de Proceder*** *a la Lic. Patricia Noemi Chumacero Viscarra, Representante Legal de la Empresa Unipersonal Constructora "KODESH" para la ejecución del proyecto:* ***"CONSTRUCCIÓN EDIFICIO POSGRADO"****, ubicado en la Av. Las Banderas s/n, propiamente en la Ciudadela Universitaria de la ciudad de Potosí, del departamento de Potosí, esto en cumplimiento de las obligaciones contractuales y para fines que corresponda.*

M. Sc. Ing. Daniely Taboada Quintana
SUPERVISOR DE OBRA

Ing. Daniely Taboada Quintana
SUPERVISOR DE OBRAS
U. A. T. F.

ING EDUARD BOSTILLOS C
RECIBIDO P/06/05/2025
